
FACHADA DA LINHA 9 (vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA A — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 15 — 32 PEÇAS — 153,3 t

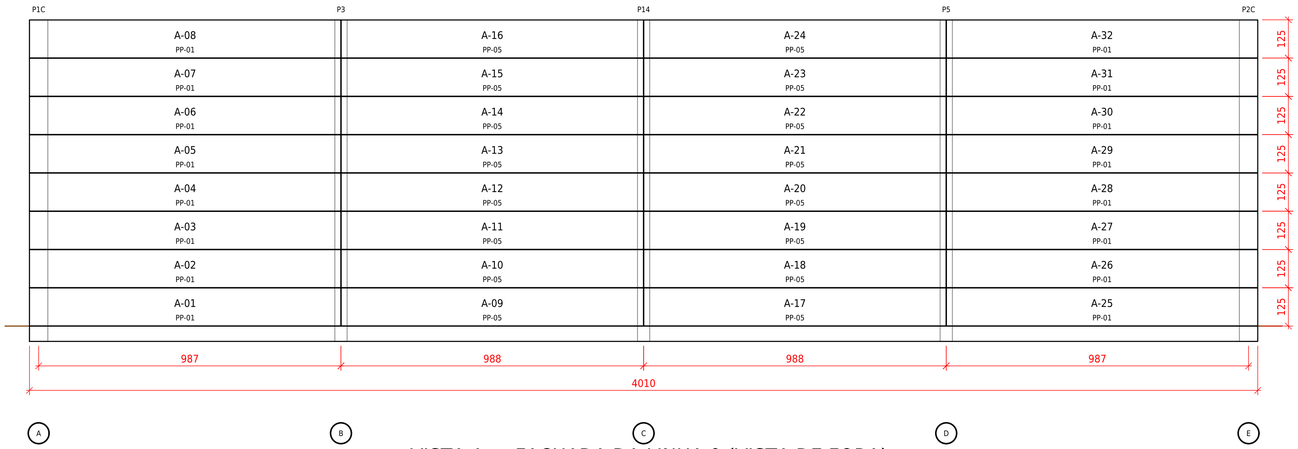

VISTA A — FACHADA DA LINHA 9 (VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	A-01	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
2	A-02	PP-01	1016,5	+1,25	4,86	placa de baixo
3	A-03	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	placa de baixo
4	A-04	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
5	A-05	PP-01	1016,5	+5,00	4,86	placa de baixo
6	A-06	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	placa de baixo
7	A-07	PP-01	1016,5	+7,50	4,86	placa de baixo
8	A-08	PP-01	1016,5	+8,75	4,86	placa de baixo
9	A-09	PP-05	987,0	+0,00	4,72	viga baldrame
10	A-10	PP-05	987,0	+1,25	4,72	placa de baixo
11	A-11	PP-05	987,0	+2,50	4,72	placa de baixo
12	A-12	PP-05	987,0	+3,75	4,72	placa de baixo
13	A-13	PP-05	987,0	+5,00	4,72	placa de baixo
14	A-14	PP-05	987,0	+6,25	4,72	placa de baixo
15	A-15	PP-05	987,0	+7,50	4,72	placa de baixo
16	A-16	PP-05	987,0	+8,75	4,72	placa de baixo
17	A-17	PP-05	987,0	+0,00	4,72	viga baldrame
18	A-18	PP-05	987,0	+1,25	4,72	placa de baixo
19	A-19	PP-05	987,0	+2,50	4,72	placa de baixo
20	A-20	PP-05	987,0	+3,75	4,72	placa de baixo
21	A-21	PP-05	987,0	+5,00	4,72	placa de baixo
22	A-22	PP-05	987,0	+6,25	4,72	placa de baixo
23	A-23	PP-05	987,0	+7,50	4,72	placa de baixo
24	A-24	PP-05	987,0	+8,75	4,72	placa de baixo
25	A-25	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
26	A-26	PP-01	1016,5	+1,25	4,86	placa de baixo
27	A-27	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	placa de baixo
28	A-28	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
29	A-29	PP-01	1016,5	+5,00	4,86	placa de baixo
30	A-30	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	placa de baixo
31	A-31	PP-01	1016,5	+7,50	4,86	placa de baixo
32	A-32	PP-01	1016,5	+8,75	4,86	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,5	16	77,8
PP-05	987,0	16	75,5
	total	32	153,3


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: A-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, chapa CL-1 soldada no IP-01 do pilar e no CH-P1 da placa antes de soltar o guindaste.
3. Placa protendida 125 × 15, C40, 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB, 77,7 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

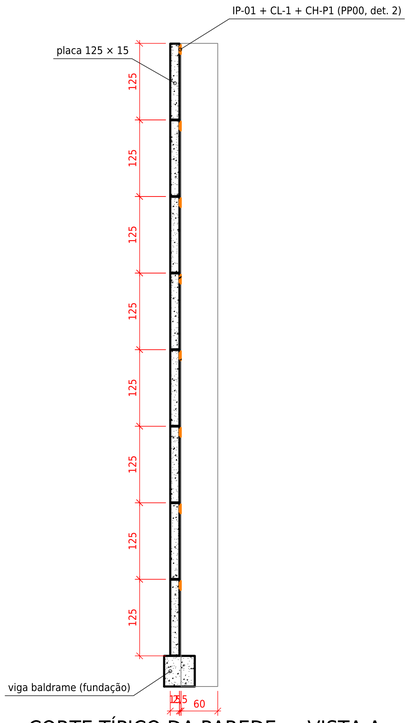

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA A

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA A: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-A	00	01/08	A1

1º DIEDRO
