
LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9 (vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA B — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 15 — 40 PEÇAS — 190,1 t

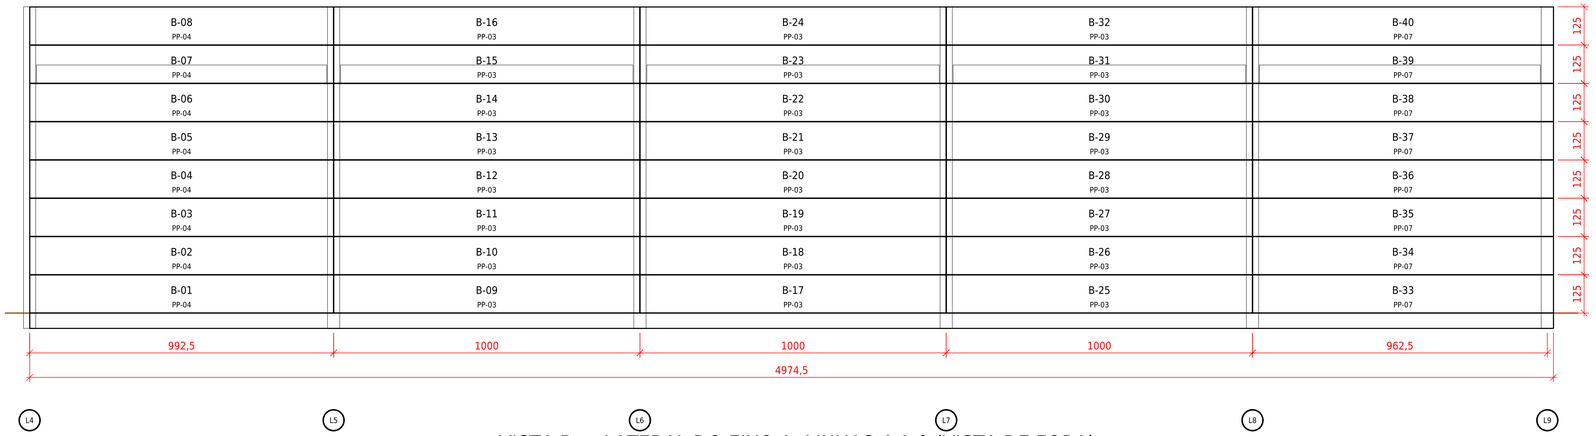

VISTA B — LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9 (VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	B-01	PP-04	991,5	+0,00	4,74	viga baldrame
2	B-02	PP-04	991,5	+1,25	4,74	placa de baixo
3	B-03	PP-04	991,5	+2,50	4,74	placa de baixo
4	B-04	PP-04	991,5	+3,75	4,74	placa de baixo
5	B-05	PP-04	991,5	+5,00	4,74	placa de baixo
6	B-06	PP-04	991,5	+6,25	4,74	placa de baixo
7	B-07	PP-04	991,5	+7,50	4,74	placa de baixo
8	B-08	PP-04	991,5	+8,75	4,74	placa de baixo
9	B-09	PP-03	999,0	+0,00	4,78	viga baldrame
10	B-10	PP-03	999,0	+1,25	4,78	placa de baixo
11	B-11	PP-03	999,0	+2,50	4,78	placa de baixo
12	B-12	PP-03	999,0	+3,75	4,78	placa de baixo
13	B-13	PP-03	999,0	+5,00	4,78	placa de baixo
14	B-14	PP-03	999,0	+6,25	4,78	placa de baixo
15	B-15	PP-03	999,0	+7,50	4,78	placa de baixo
16	B-16	PP-03	999,0	+8,75	4,78	placa de baixo
17	B-17	PP-03	999,0	+0,00	4,78	viga baldrame
18	B-18	PP-03	999,0	+1,25	4,78	placa de baixo
19	B-19	PP-03	999,0	+2,50	4,78	placa de baixo
20	B-20	PP-03	999,0	+3,75	4,78	placa de baixo
21	B-21	PP-03	999,0	+5,00	4,78	placa de baixo
22	B-22	PP-03	999,0	+6,25	4,78	placa de baixo
23	B-23	PP-03	999,0	+7,50	4,78	placa de baixo
24	B-24	PP-03	999,0	+8,75	4,78	placa de baixo
25	B-25	PP-03	999,0	+0,00	4,78	viga baldrame
26	B-26	PP-03	999,0	+1,25	4,78	placa de baixo
27	B-27	PP-03	999,0	+2,50	4,78	placa de baixo
28	B-28	PP-03	999,0	+3,75	4,78	placa de baixo
29	B-29	PP-03	999,0	+5,00	4,78	placa de baixo
30	B-30	PP-03	999,0	+6,25	4,78	placa de baixo
31	B-31	PP-03	999,0	+7,50	4,78	placa de baixo
32	B-32	PP-03	999,0	+8,75	4,78	placa de baixo
33	B-33	PP-07	982,0	+0,00	4,69	viga baldrame
34	B-34	PP-07	982,0	+1,25	4,69	placa de baixo
35	B-35	PP-07	982,0	+2,50	4,69	placa de baixo
36	B-36	PP-07	982,0	+3,75	4,69	placa de baixo
37	B-37	PP-07	982,0	+5,00	4,69	placa de baixo
38	B-38	PP-07	982,0	+6,25	4,69	placa de baixo
39	B-39	PP-07	982,0	+7,50	4,69	placa de baixo
40	B-40	PP-07	982,0	+8,75	4,69	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-03	999,0	24	114,6
PP-04	991,5	8	37,9
PP-07	982,0	8	37,6
	total	40	190,1


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: B-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, chapa CL-1 soldada no IP-01 do pilar e no CH-P1 da placa antes de soltar o guindaste.
3. Placa protendida 125 × 15, C40, 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB, 77,7 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

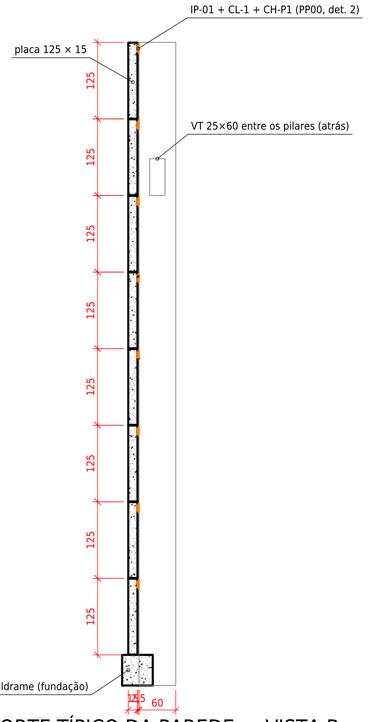

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA B

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada

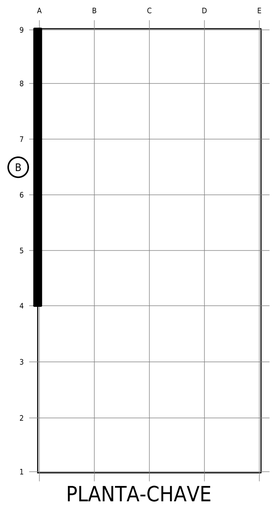

PLANTA-CHAVE

ESC. 1:550 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA B: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-B	00	02/08	A1

1º DIEDRO
