
PAREDE INTERNA DA LINHA 4 (PORTÕES) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA C — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 15 — 24 PEÇAS — 84,4 t

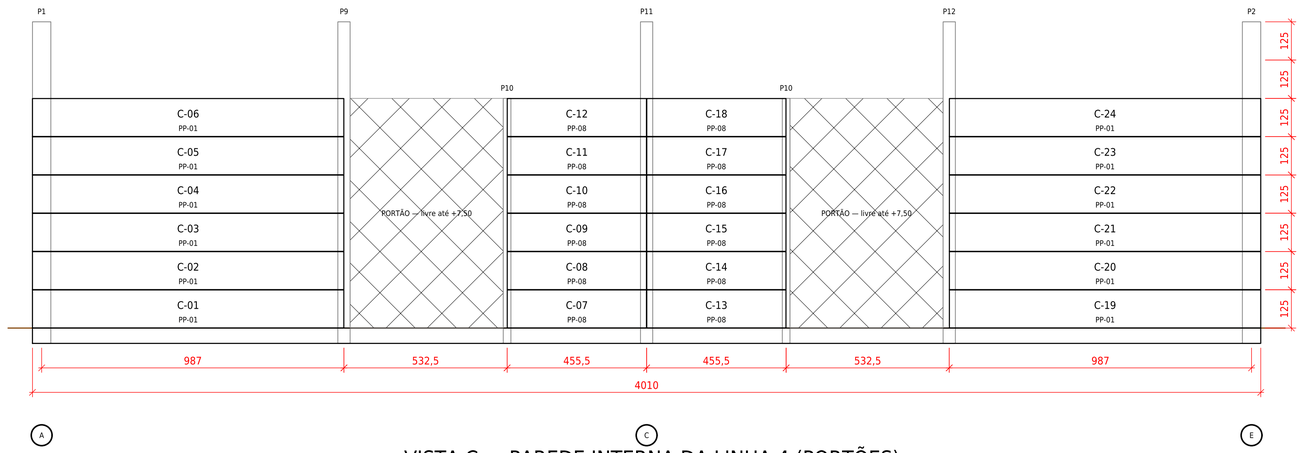

VISTA C — PAREDE INTERNA DA LINHA 4 (PORTÕES)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	C-01	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
2	C-02	PP-01	1016,5	+1,25	4,86	placa de baixo
3	C-03	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	placa de baixo
4	C-04	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
5	C-05	PP-01	1016,5	+5,00	4,86	placa de baixo
6	C-06	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	placa de baixo
7	C-07	PP-08	454,5	+0,00	2,17	viga baldrame
8	C-08	PP-08	454,5	+1,25	2,17	placa de baixo
9	C-09	PP-08	454,5	+2,50	2,17	placa de baixo
10	C-10	PP-08	454,5	+3,75	2,17	placa de baixo
11	C-11	PP-08	454,5	+5,00	2,17	placa de baixo
12	C-12	PP-08	454,5	+6,25	2,17	placa de baixo
13	C-13	PP-08	454,5	+0,00	2,17	viga baldrame
14	C-14	PP-08	454,5	+1,25	2,17	placa de baixo
15	C-15	PP-08	454,5	+2,50	2,17	placa de baixo
16	C-16	PP-08	454,5	+3,75	2,17	placa de baixo
17	C-17	PP-08	454,5	+5,00	2,17	placa de baixo
18	C-18	PP-08	454,5	+6,25	2,17	placa de baixo
19	C-19	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
20	C-20	PP-01	1016,5	+1,25	4,86	placa de baixo
21	C-21	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	placa de baixo
22	C-22	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
23	C-23	PP-01	1016,5	+5,00	4,86	placa de baixo
24	C-24	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,5	12	58,3
PP-08	454,5	12	26,1
	total	24	84,4


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: C-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, chapa CL-1 soldada no IP-01 do pilar e no CH-P1 da placa antes de soltar o guindaste.
3. Placa protendida 125 × 15, C40, 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB, 77,7 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Placas até +7,50; acima, até a telha, fechamento leve na face da TS-01 (as terças cruzam a linha 4 acima de +8,37) — pendência. Portões P9–P10 e P10–P12 livres até +7,50.
5. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

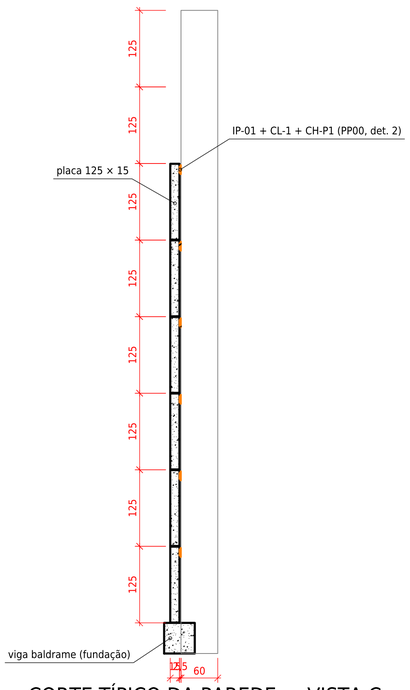

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA C

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA C: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-C	00	03/08	A1

1º DIEDRO
