

LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2 · LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2 · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA H E J — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 15 — 12 PEÇAS — 56,5 t

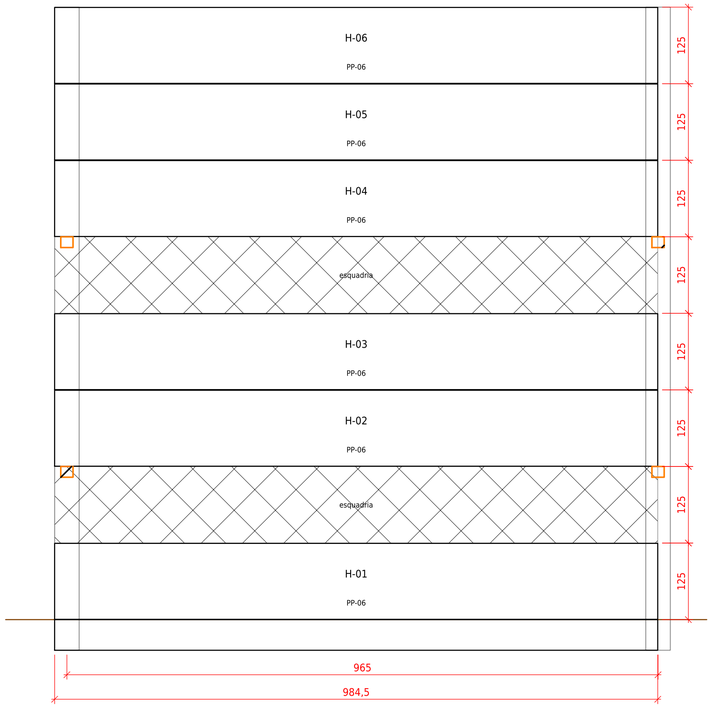


VISTA H — LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

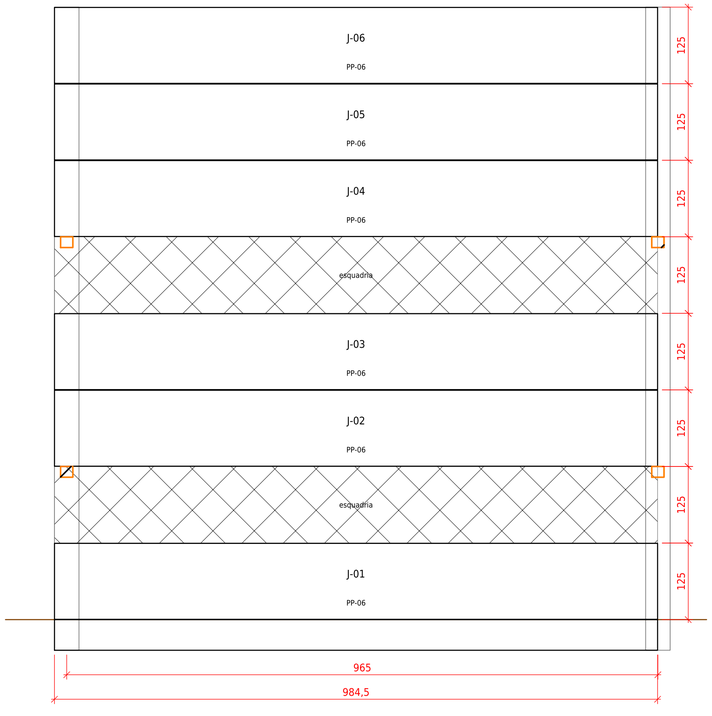


VISTA J — LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

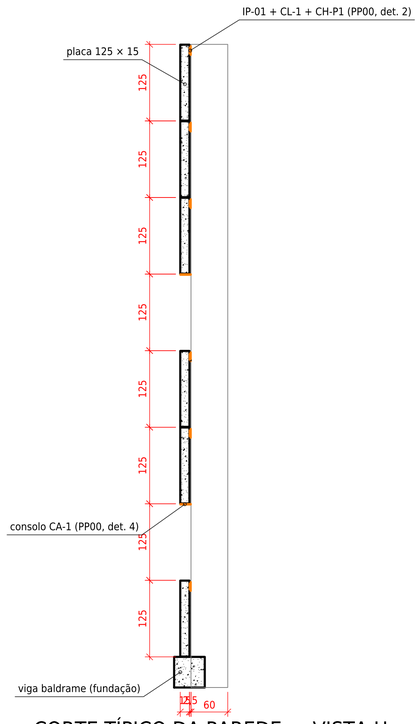

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA H

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)

SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	H-01	PP-06	984,5	+0,00	4,71	viga baldrame
2	H-02	PP-06	984,5	+2,50	4,71	2 consolos CA-1
3	H-03	PP-06	984,5	+3,75	4,71	placa de baixo
4	H-04	PP-06	984,5	+6,25	4,71	2 consolos CA-1
5	H-05	PP-06	984,5	+7,50	4,71	placa de baixo
6	H-06	PP-06	984,5	+8,75	4,71	placa de baixo
1	J-01	PP-06	984,5	+0,00	4,71	viga baldrame
2	J-02	PP-06	984,5	+2,50	4,71	2 consolos CA-1
3	J-03	PP-06	984,5	+3,75	4,71	placa de baixo
4	J-04	PP-06	984,5	+6,25	4,71	2 consolos CA-1
5	J-05	PP-06	984,5	+7,50	4,71	placa de baixo
6	J-06	PP-06	984,5	+8,75	4,71	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-06	984,5	12	56,5
	total	12	56,5

NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: H-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, chapa CL-1 soldada no IP-01 do pilar e no CH-P1 da placa antes de soltar o guindaste.
3. Placa protendida 125 × 15, C40, 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB, 77,7 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consolos metálicos CA-1 (8 nesta prancha, hachurados na elevação) soldados no IP-01 do pilar antes de montar a peça que apoiam (PP00, detalhe 4).
5. Faixas hachuradas: esquadrias do anexo (R01), sem placa, de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25; placa acima de cada faixa apoiada em 2 CA-1.
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS H E J: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-HJ	00	07/08	A1

1º DIEDRO
