
FACHADA DA LINHA 1 (anexo, vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA I — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 15 — 25 PEÇAS — 114,1 t

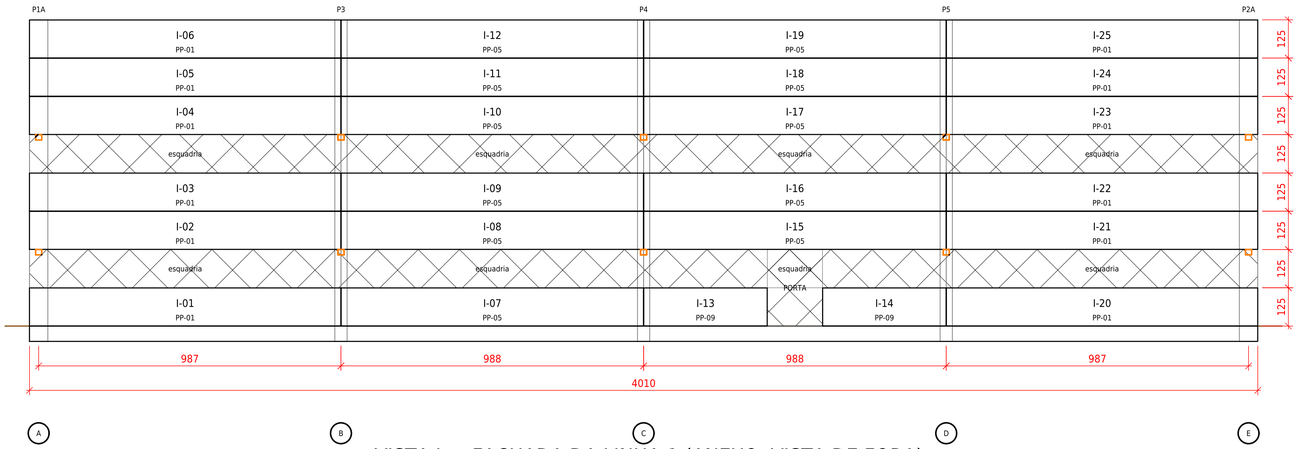

VISTA I — FACHADA DA LINHA 1 (ANEXO, VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	I-01	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
2	I-02	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	2 consolos CA-1
3	I-03	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
4	I-04	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	2 consolos CA-1
5	I-05	PP-01	1016,5	+7,50	4,86	placa de baixo
6	I-06	PP-01	1016,5	+8,75	4,86	placa de baixo
7	I-07	PP-05	987,0	+0,00	4,72	viga baldrame
8	I-08	PP-05	987,0	+2,50	4,72	2 consolos CA-1
9	I-09	PP-05	987,0	+3,75	4,72	placa de baixo
10	I-10	PP-05	987,0	+6,25	4,72	2 consolos CA-1
11	I-11	PP-05	987,0	+7,50	4,72	placa de baixo
12	I-12	PP-05	987,0	+8,75	4,72	placa de baixo
13	I-13	PP-09	403,0	+0,00	1,93	viga baldrame
14	I-14	PP-09	403,0	+0,00	1,93	viga baldrame
15	I-15	PP-05	987,0	+2,50	4,72	2 consolos CA-1
16	I-16	PP-05	987,0	+3,75	4,72	placa de baixo
17	I-17	PP-05	987,0	+6,25	4,72	2 consolos CA-1
18	I-18	PP-05	987,0	+7,50	4,72	placa de baixo
19	I-19	PP-05	987,0	+8,75	4,72	placa de baixo
20	I-20	PP-01	1016,5	+0,00	4,86	viga baldrame
21	I-21	PP-01	1016,5	+2,50	4,86	2 consolos CA-1
22	I-22	PP-01	1016,5	+3,75	4,86	placa de baixo
23	I-23	PP-01	1016,5	+6,25	4,86	2 consolos CA-1
24	I-24	PP-01	1016,5	+7,50	4,86	placa de baixo
25	I-25	PP-01	1016,5	+8,75	4,86	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,5	12	58,3
PP-05	987,0	11	51,9
PP-09	403,0	2	3,9
	total	25	114,1


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: I-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, chapa CL-1 soldada no IP-01 do pilar e no CH-P1 da placa antes de soltar o guindaste.
3. Placa protendida 125 × 15, C40, 8 cord. Ø9,5 CP-190 RB, 77,7 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consolos metálicos CA-1 (16 nesta prancha, hachurados na elevação) soldados no IP-01 do pilar antes de montar a peça que apoiam (PP00, detalhe 4).
5. Faixas hachuradas: esquadrias do anexo (R01), sem placa, de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25; placa acima de cada faixa apoiada em 2 CA-1. Porta: 180 × 250 (a confirmar).
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

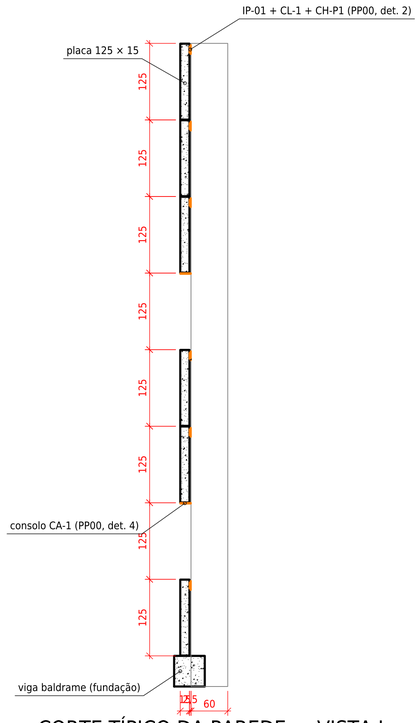

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA I

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada

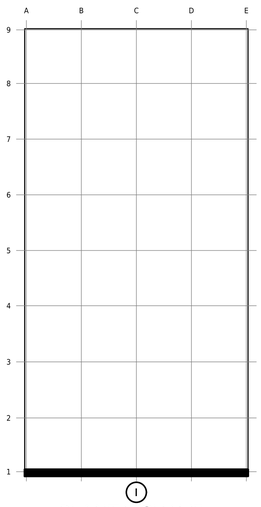

PLANTA-CHAVE

ESC. 1:550 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA I: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-I	00	08/08	A1

1º DIEDRO
