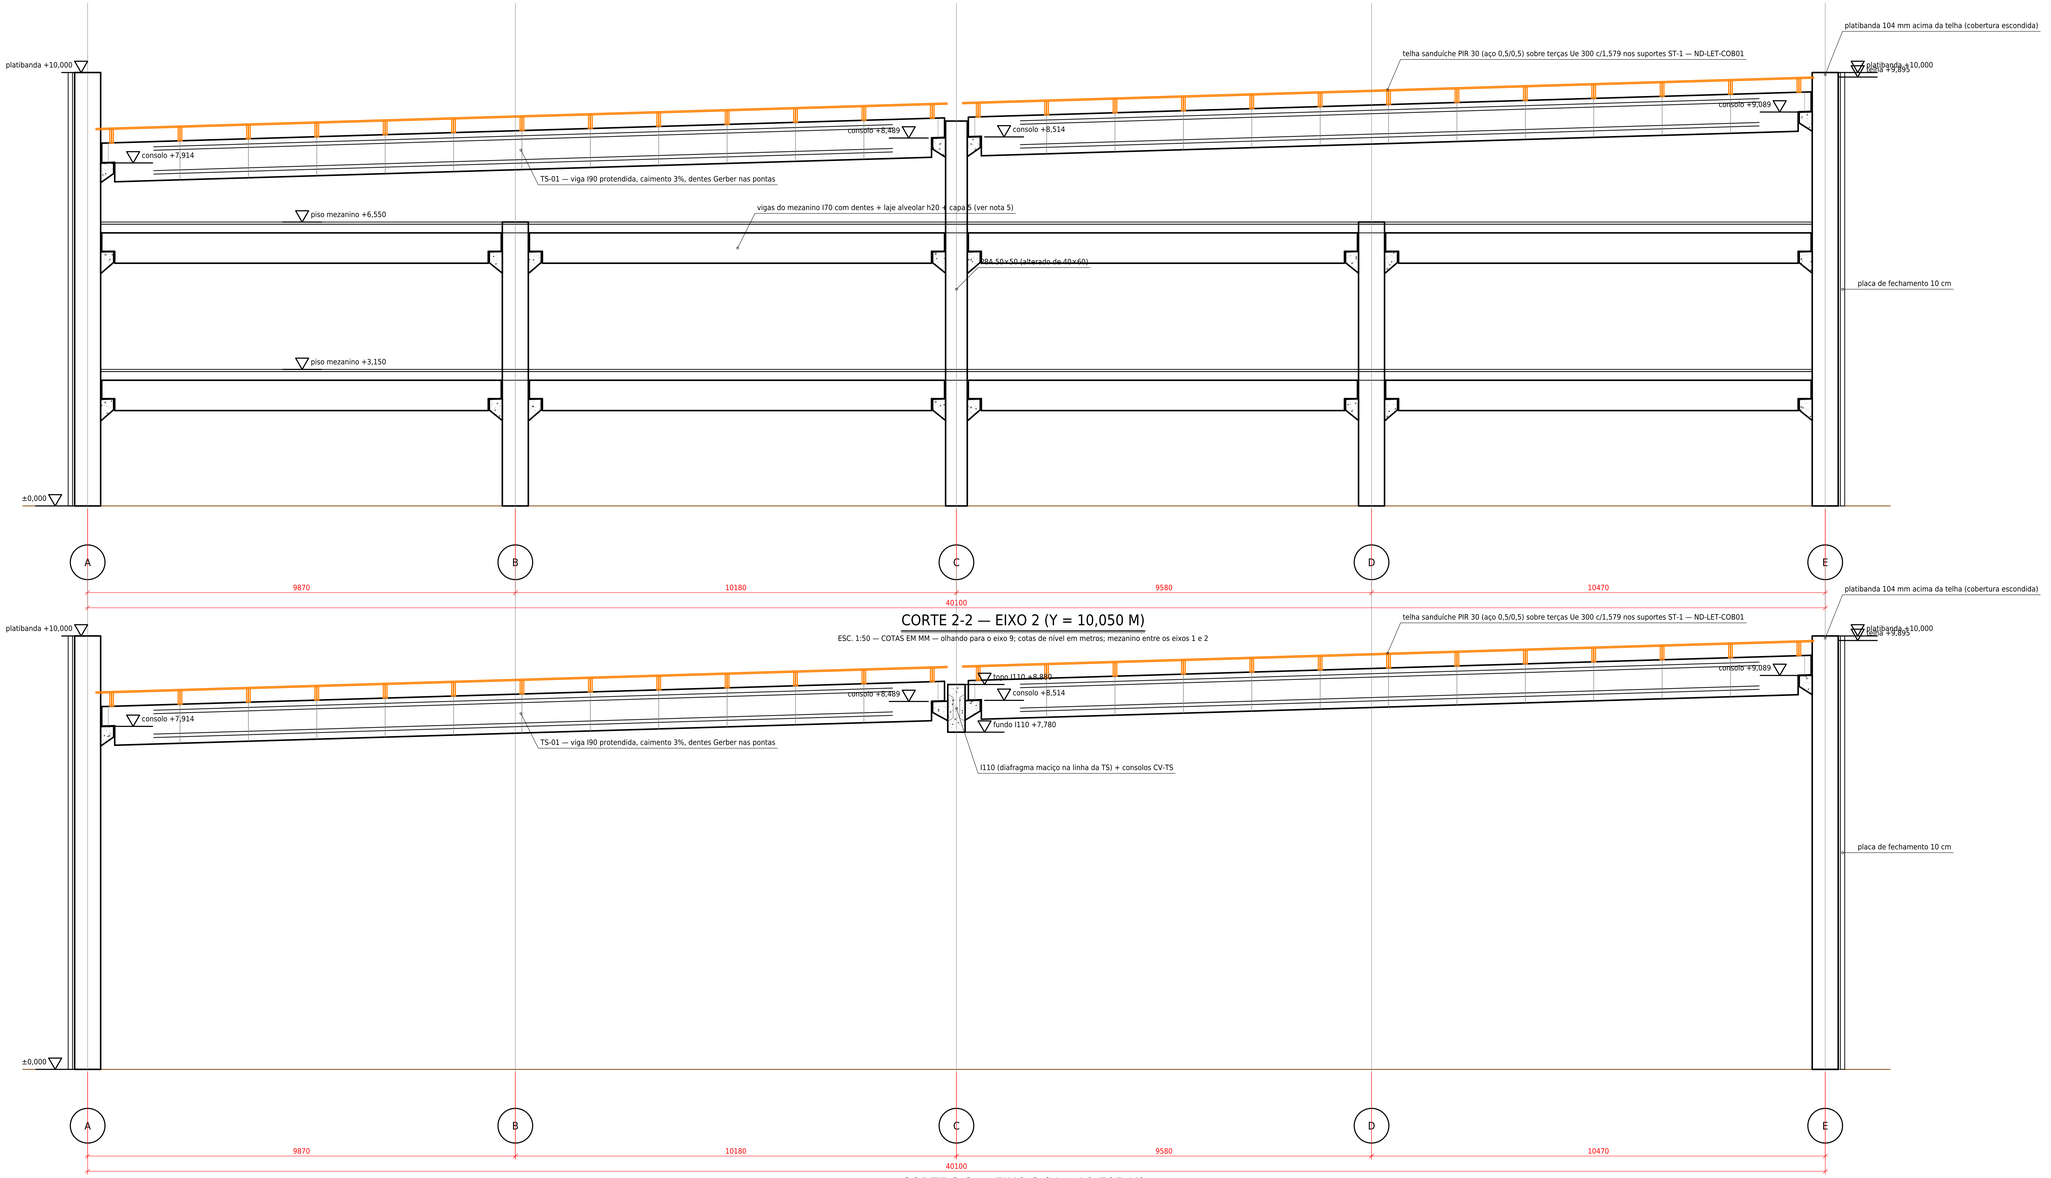


CORTE 2-2 — EIXO 2 (Y = 10,050 M)

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — olhando para o eixo 9; cotas de nível em metros; mezanino entre os eixos 1 e 2

CORTE 3-3 — EIXO 3 (Y = 19,705 M)

ESC. 1:50 — COTAS EM MM — olhando para o eixo 9; cotas de nível em metros

NÍVEIS (m)	
ELEMENTO	NÍVEL
Consolo P1 (lado baixo)	+7,914
Consolo centro, lado esq.	+8,489
Consolo centro, lado dir.	+8,514
Consolo P2 (lado alto)	+9,089
Topo / fundo da I110	+8,880 / +7,780
Assento da I110 no pilar central	+8,220
Telha junto ao P1 / ao P2	+8,712 / +9,895
Platibanda (todas)	+10,000
Pisos do mezanino	+3,150 / +6,550

NOTAS

1. Cortes gerados do mesmo modelo usado na checagem das ligações (pinos, folgas e terças conferidos em 28 apoios).
2. Cobertura baixada 0,62 m para ficar escondida: telha junto ao P2 em +9,896, 104 mm abaixo da platibanda +10,000 (pedido: 100 mm).
3. TS-01 com 19,459 m entre pontas (a prumo), dentes de 450 × 300 nas duas pontas; terças c/1,579 m,
4. Pilar central P8A 50×50 (era 40×60): com 60 na direção x a face ficava 25 mm dentro da ponta da TS-01.
5. LAJE h20 + 5 (pedido): com 500 kgf/m² em 9,75 m e 7 Ø12,7 por painel NÃO atende na seção genérica — ELU 209 > 192 kN·m por painel, descompressão só até 9,05 m. Desenhada para análise; confirmar na tabela do fabricante ou voltar à h26,5 + 5.
6. Vigas do mezanino I70 (mesma fôrma, 10 Ø12,7): atendem à flexão com a laje h20; dente de 425 em verificação por MEF. Ganham 20 cm de pé-direito sobre a I90.
7. Fundações e cálices em projeto próprio. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA ANÁLISE, NÃO EXECUTAR.

DETALHE 1 — APOIO NO PILAR P1 — LADO BAIXO

ESC. 1:20 — COTAS EM MM

DETALHE 2 — APOIO NA I110 — EIXO 3

ESC. 1:20 — COTAS EM MM

DETALHE 3 — APOIO NO PILAR P2 — LADO ALTO

ESC. 1:20 — COTAS EM MM

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA ANÁLISE

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: CORTES TRANSVERSAIS DA ESTRUTURA (EIXOS 2 E 3) E APOIOS DA COBERTURA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CT01	00	01/01	A0

1º DIEDRO
