
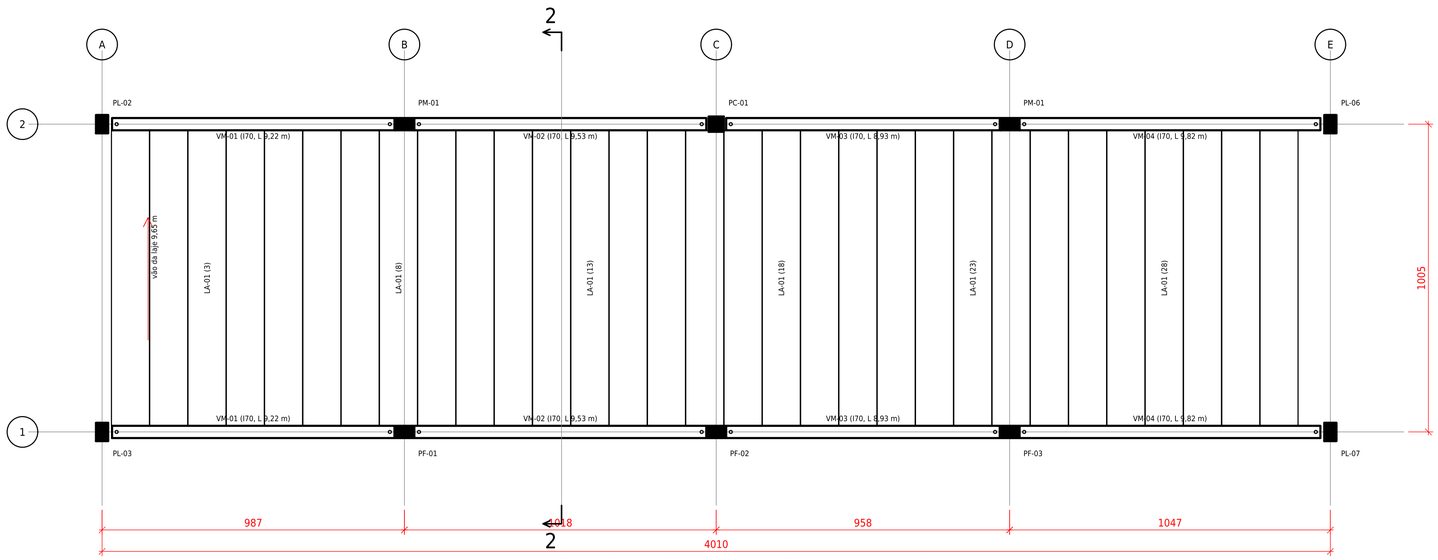



PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +3,15

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +2,200

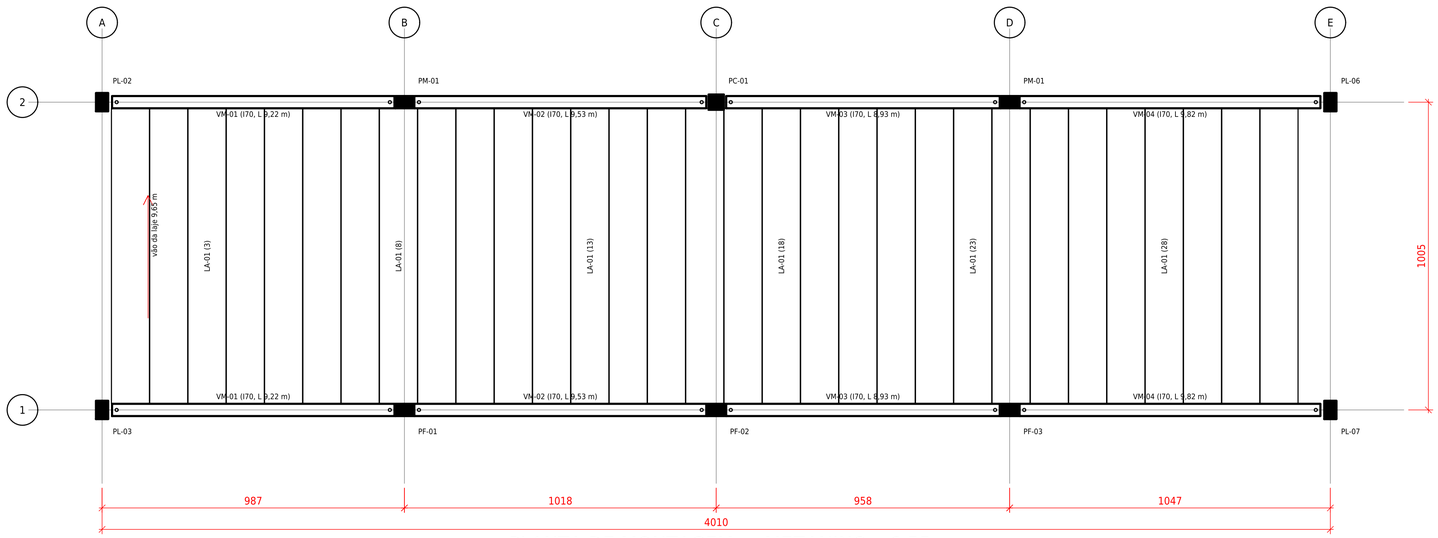

PLANTA DE MONTAGEM — MEZANINO +6,55

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — linhas 1–2; assento dos consolos CP-MEZ em +5,600

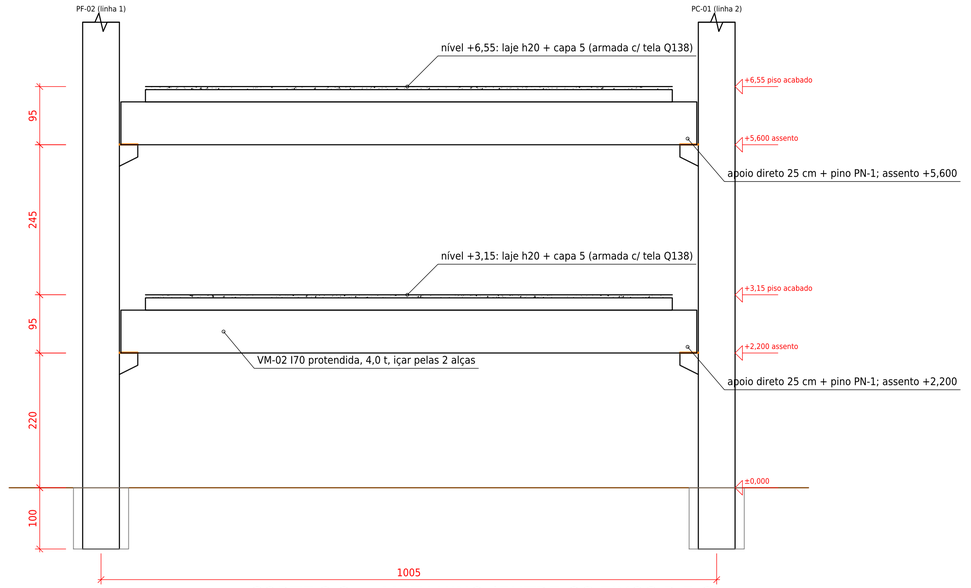

CORTE 2-2 — MEZANINO (ENTRE OS EIXOS B E C)

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — vigas VM (sem dente) nos consolos CP-MEZ; laje alveolar h20 + capa 5

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — MEZANINO

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
VM-01	Viga I70 protendida sem dente, L 9,22 m	4	4,6	CP-MEZ +2,200 / +5,600
VM-02	Viga I70 protendida sem dente, L 9,53 m	4	4,8	CP-MEZ +2,200 / +5,600
VM-03	Viga I70 protendida sem dente, L 8,93 m	4	4,5	CP-MEZ +2,200 / +5,600
VM-04	Viga I70 protendida sem dente, L 9,82 m	4	4,9	CP-MEZ +2,200 / +5,600
LA-01	Laje alveolar h20, 125×965 (confirmar c/ fabricante)	62	3,2	sobre as VM, apoio 10 cm + neoprene
CP-MEZ	Consolo 40×30×35/20 nos pilares das linhas 1–2 (2 níveis)	20	—	ver pranchas dos pilares
PM-01	Pilar 40×60 do mezanino (B2, D2), topo +6,55 + capa	2	4,6	cálice −1,00

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Pilares das linhas 1 e 2 já grauteados e com 24 h (ND-LET-MON01, etapa 2).
2. Nível +3,15: vigas VM-01 a VM-04 na linha 1 e depois na linha 2; neoprene no consolo, pino numa ponta grauteado, outra com graute flexível.
3. Lajes alveolares LA-01 de A para E, apoio mínimo 10 cm sobre a viga, faixa de neoprene; chavetas grauteadas antes da capa.
4. Capa de 5 cm com tela Q138 após as chavetas; não carregar a laje antes de 7 dias (ou fck ≥ 20 MPa).
5. Repetir para o nível +6,55. A cobertura das linhas 1–2 só é montada depois da capa do +6,55.
6. Laje alveolar h20 sem escoramento; vigas VM sem escoramento (protendidas, 2º estágio na capa).

NOTAS

1. Laje alveolar h20 + 5 em 9,65 m com 500 kgf/m²: a seção genérica (7 Ø12,7) NÃO passou no ELU; o fabricante deve apresentar tabela de carga ou subir para h26,5 + 5.
2. Vigas VM I70 sem dente (o dente de 42,5 cm foi reprovado no MEF): apoio direto de 25 cm nos consolos CP-MEZ, assentos +2,200 e +5,600 (ND-LET-VM01 e ND-LET-PM01).
3. Tolerâncias NBR 9062:2017: pilar ±10 mm; consolo ±10 mm; folga de ponta 25 mm; apoio da laje ≥ 10 cm medido após a montagem.
4. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DO MEZANINO (+3,15 E +6,55) — VIGAS VM, LAJES ALVEOLARES, CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON02	00	02/02	A1

1º DIEDRO
