

LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4 (aberta até +7,50) · LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4 (aberta até +7,50) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA E E F — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 8 PEÇAS — 25,6 t

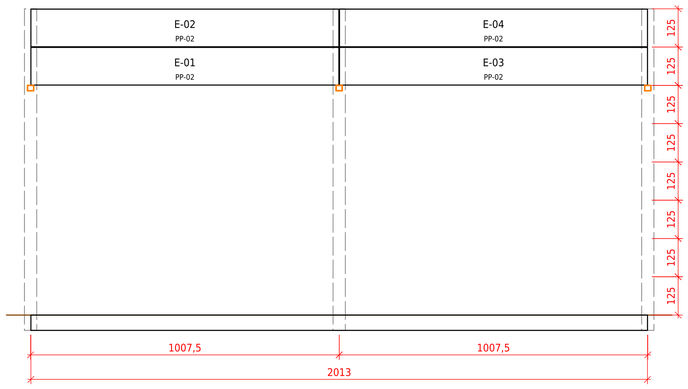

VISTA E — LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4 (ABERTA ATÉ +7,50)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

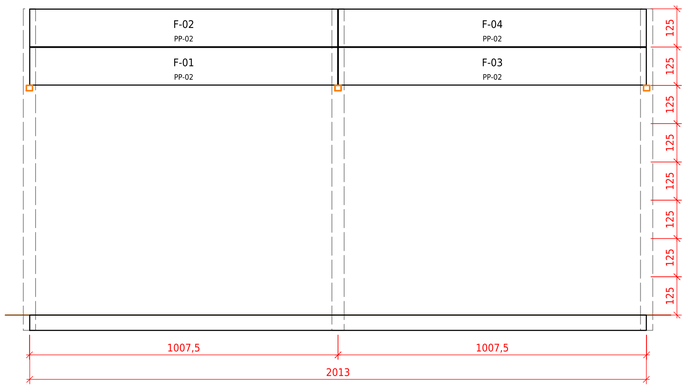

VISTA F — LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4 (ABERTA ATÉ +7,50)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	E-01	PP-02	1005,5	+7,50	3,20	2 consolos CA-1
2	E-02	PP-02	1005,5	+8,75	3,20	placa de baixo
3	E-03	PP-02	1005,5	+7,50	3,20	2 consolos CA-1
4	E-04	PP-02	1005,5	+8,75	3,20	placa de baixo
1	F-01	PP-02	1005,5	+7,50	3,20	2 consolos CA-1
2	F-02	PP-02	1005,5	+8,75	3,20	placa de baixo
3	F-03	PP-02	1005,5	+7,50	3,20	2 consolos CA-1
4	F-04	PP-02	1005,5	+8,75	3,20	placa de baixo

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-02	1005,5	8	25,6
	total	8	25,6


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: E-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima; em cada ponta, cantoneira CL-1 parafusada no trilho TR-1 do pilar (parafuso T M16) e na bucha BR-1 da placa (M16) antes de soltar o guindaste. Nenhuma solda.
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB alinhadas (4 por face, cobrimento 2,0), 138,2 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consolos metálicos CA-1 (8 nesta prancha, hachurados na elevação): cantoneira L 152×102×19 parafusada com 2 M20 nas luvas IB-1 do pilar antes de montar a peça que apoiam (PP00, detalhe 4).
5. E (eixo A) e F (eixo E): abertas até +7,50; as 2 fiadas de cima apoiam em 2 consolos CA-1 parafusados nos pilares e vencem o vão entre eles (rev04: sem vigas de travamento — não há ponte rolante; estabilidade pela cobertura e pelos pilares engastados, NBR 9062:2017 5.1.2.1).
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

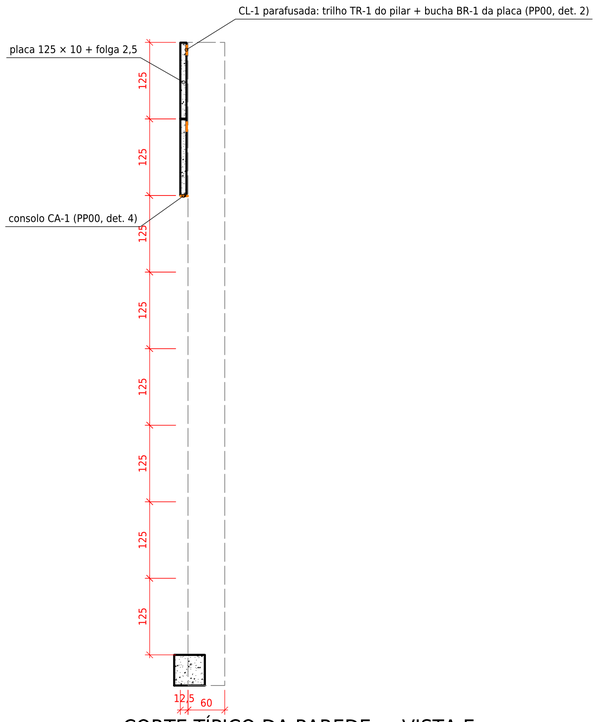

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA E

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS E E F: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-EF	04	05/08	A1

1º DIEDRO
