
locação das vistas; cada vista tem a sua prancha de produção e montagem (ND-LET-PP-A a PP-I); placa típica na ND-LET-PP00

CM PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 203 PEÇAS · 9 TIPOS · 10 VISTAS · 620 t

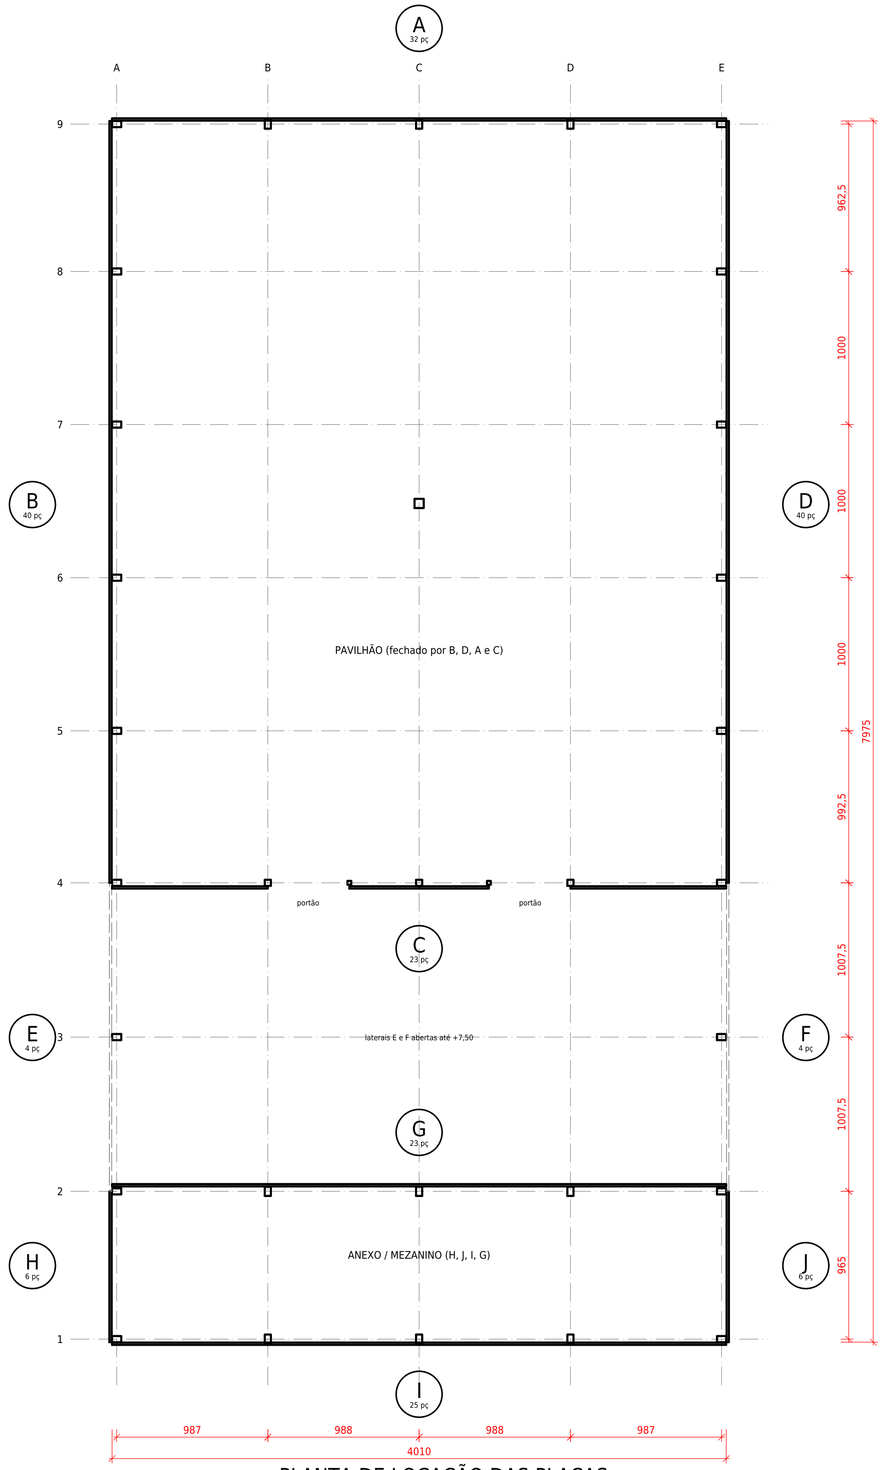

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS PLACAS

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — letras = vistas do R01; pç = peças da vista

ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS

ORD.	VISTA	PAREDE	PEÇAS	PESO (t)	PRANCHA
1	I	FACHADA DA LINHA 1	25	75,8	ND-LET-PP-I
2	H	LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2	6	18,8	ND-LET-PP-HJ
3	J	LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2	6	18,8	ND-LET-PP-HJ
4	G	PAREDE INTERNA DA LINHA 2	23	73,2	ND-LET-PP-G
5	E	LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4	4	12,8	ND-LET-PP-EF
6	F	LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4	4	12,8	ND-LET-PP-EF
7	C	PAREDE INTERNA DA LINHA 4	23	52,9	ND-LET-PP-C
8	B	LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9	40	126,4	ND-LET-PP-B
9	D	LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9	40	126,4	ND-LET-PP-D
10	A	FACHADA DA LINHA 9	32	101,9	ND-LET-PP-A
		total	203	619,6	

TIPOS × VISTAS

TIPO	L (cm)	QT	VISTA: QUANTIDADE
PP-01	1016,0	50	A: 16 C: 11 G: 11 I: 12
PP-02	1005,5	8	E: 4 F: 4
PP-03	998,0	48	B: 24 D: 24
PP-04	990,5	16	B: 8 D: 8
PP-05	986,0	39	A: 16 G: 12 I: 11
PP-06	984,0	12	H: 6 J: 6
PP-07	981,5	16	B: 8 D: 8
PP-08	453,5	12	C: 12
PP-09	402,0	2	I: 2

NOTAS

1. Geometria pela PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DE PILARES do R01: eixos A–E a 9,87 / 9,88 / 9,88 / 9,87 m; linhas 1–9 a 9,65 / 10,075 / 10,075 / 9,925 / 10,00 / 10,00 / 10,00 / 9,625 m (79,35 m entre eixos).
2. Vistas como no R01: B e D (linhas 4–9) fechadas, 8 fiadas; E (eixo A) e F (eixo E), linhas 2–4, só as 2 fiadas de cima (rev04, sem VT); H, J (anexo) e I (fachada da linha 1) com faixas de esquadria de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25 e porta na I; A (linha 9) fechada.
3. Paredes internas C (linha 4) e G (linha 2) com placas até +7,50 (vão A–B até +6,25: a TS-01 desce a +7,19 junto ao eixo A); acima, até a telha, fechamento metálico leve — confirmar com o cliente.
4. Linha 4: 2 portões (P9–P10 e P10–P12), livres até +7,40 (topo do PG-01), sob a TS-01; o trecho P10–P11–P10 é fechado.
5. Placas 125 × 10 (rev03) por fora dos pilares (folga 25 mm), juntas verticais de 20 mm no eixo dos pilares (rev04; tolerância de comprimento da placa ±5 mm); ligações parafusadas (trilho TR-1 + bucha BR-1 + CL-1) e consolos CA-1 parafusados, sem solda: ND-LET-PP00.
6. Rev04: sem vigas de travamento VT (só entram com ponte rolante ou carga especificada); o fechamento é isostático (CL-1 com furo oblongo) e não é contado no contraventamento — a contribuição medida no modelo global foi desprezível (9,9 → 9,8 mm).
7. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; E E F ABERTAS ATÉ +7,50; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACAS 125 × 10; LIGAÇÕES SEM SOLDA; VT DO EIXO A A +6,25; PORTÕES ATÉ
02	12/10/2026	GEOMETRIA DA LOCAÇÃO DO R01; H/J LATERAIS DO ANEXO; E/F ABERTAS ATÉ +7
01	12/10/2026	LOCAÇÃO E VISTAS CONFORME R01 (A–J)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO — LOCAÇÃO CONFORME AS VISTAS DO R01 (A A J), ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS E PENDÊNCIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
1:200	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CM01	04	01/01	A1

1º DIEDRO
