
locação das vistas; cada vista tem a sua prancha de produção e montagem (ND-LET-PP-A a PP-I); placa típica na ND-LET-PP00

CM PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 204 PEÇAS · 16 TIPOS · 10 VISTAS · 619 t

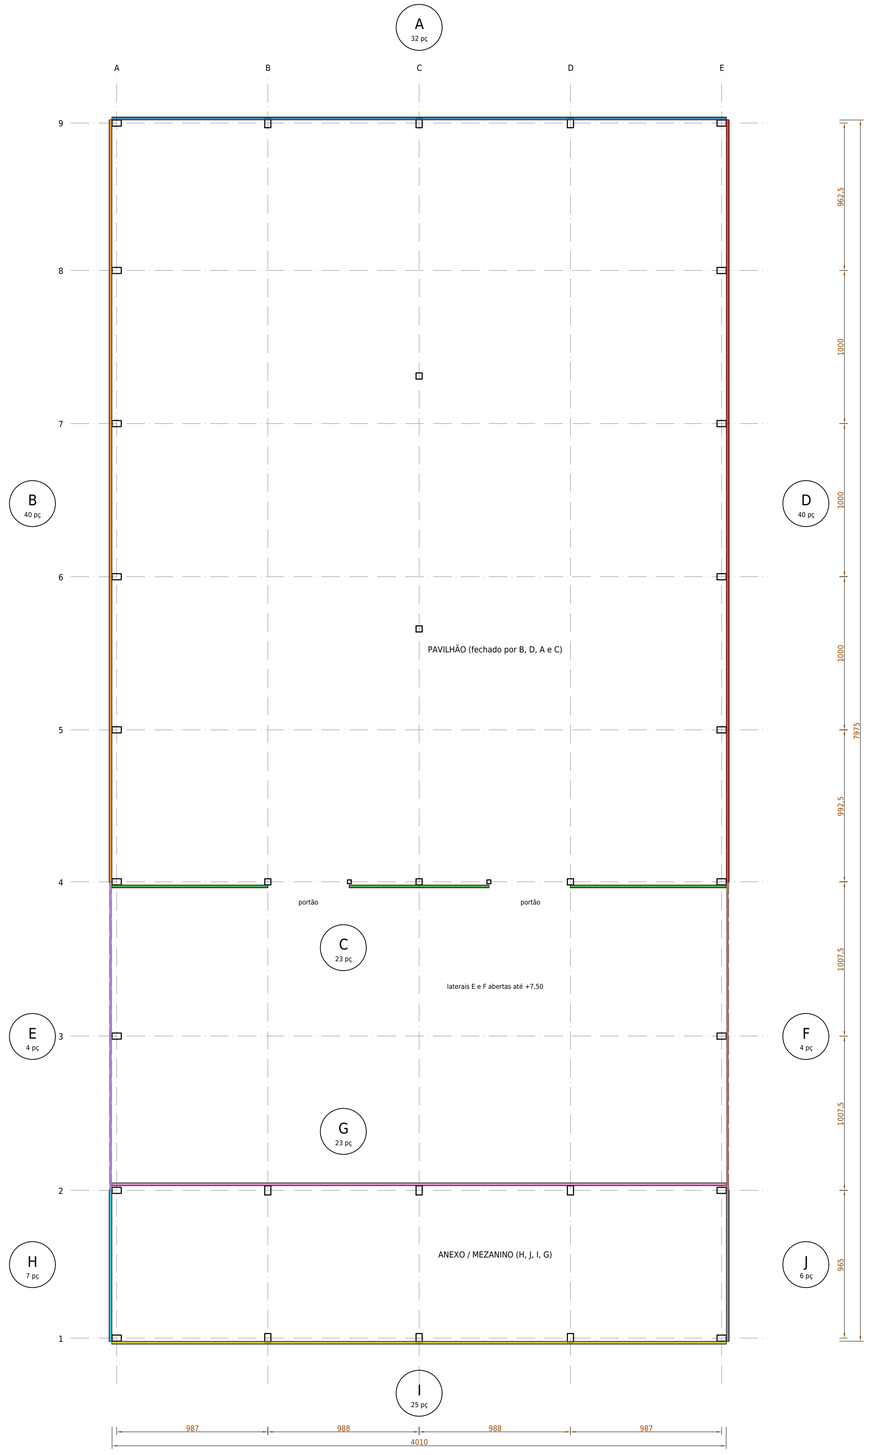

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS PLACAS

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — letras = vistas do R01; pç = peças da vista

- VISTA A — FACHADA DA LINHA 9
- VISTA B — LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9
- VISTA C — PAREDE INTERNA DA LINHA 4
- VISTA D — LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9
- VISTA E — LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4
- VISTA F — LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4
- VISTA G — PAREDE INTERNA DA LINHA 2
- VISTA H — LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2
- VISTA I — FACHADA DA LINHA 1
- VISTA J — LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2

CORES DAS PAREDES (VISTAS)

ESC. 1:1 — COTAS EM MM — mesmas cores nas pranchas PP-x e no isométrico

ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS


ORD.	VISTA	PAREDE	PEÇAS	PESO (t)	PRANCHA
1	C	PAREDE INTERNA DA LINHA 4	23	52,7	ND-LET-PP-C
2	G	PAREDE INTERNA DA LINHA 2	23	73,0	ND-LET-PP-G
3	I	FACHADA DA LINHA 1	25	75,8	ND-LET-PP-I
4	H	LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2	7	18,5	ND-LET-PP-HJ
5	J	LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2	6	18,8	ND-LET-PP-HJ
6	E	LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4	4	12,8	ND-LET-PP-EF
7	F	LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4	4	12,8	ND-LET-PP-EF
8	B	LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9	40	126,4	ND-LET-PP-B
9	D	LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9	40	126,4	ND-LET-PP-D
10	A	FACHADA DA LINHA 9	32	101,9	ND-LET-PP-A
		total	204	619,0	

TIPOS × VISTAS

TIPO	L (cm)	QT	VISTA: QUANTIDADE
PP-01	1016,0	50	A: 16 C: 11 G: 11 I: 12
PP-02	1005,5	8	E: 4 F: 4
PP-03	998,0	48	B: 24 D: 24
PP-04	990,5	16	B: 8 D: 8
PP-05RD	986,0	1	G: 1
PP-05RE	986,0	1	G: 1
PP-05P	986,0	1	I: 1
PP-05	986,0	36	A: 16 G: 10 I: 10
PP-06	984,0	11	H: 5 J: 6
PP-07	981,5	16	B: 8 D: 8
PP-10	783,0	1	H: 1
PP-08RD	453,5	1	C: 1
PP-08RE	453,5	1	C: 1
PP-08	453,5	10	C: 10
PP-09	401,0	2	I: 2
PP-11	107,0	1	H: 1

NOTAS

1. Geometria pela PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DE PILARES do R01: eixos A-E a 9,87 / 9,88 / 9,88 / 9,87 m; linhas 1-9 a 9,65 / 10,075 / 10,075 / 9,925 / 10,00 / 10,00 / 10,00 / 9,625 m (79,35 m entre eixos).
2. Vistas como no R01: B e D (linhas 4–9) fechadas, 8 fiadas; E (eixo A) e F (eixo E), linhas 2–4, só as 2 fiadas de cima (rev04, sem VT); H, J (anexo) e I (fachada da linha 1) com faixas de esquadria de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25 e porta na I; A (linha 9) fechada.
3. Paredes internas C (linha 4) e G (linha 2) com placas até +7,50 (vão A–B até +6,25: a viga de cobertura desce a +7,19 junto ao eixo A); acima, até a telha, fechamento metálico leve — confirmar com o cliente.
4. Linha 4: 2 portões 500 × 750 (P27–P19, P21 e P19, P21–P15), livres até +7,50 (DEC-059: PG apoiam a V410, V411); placa PV-1 sobre o portão P19–P15; o trecho P19, P21–P20–P19, P21 é fechado.
5. Placas 125 × 10 (rev03) por fora dos pilares (folga 25 mm), juntas verticais de 20 mm no eixo dos pilares (rev04; tolerância de comprimento da placa ±5 mm); rev06 (DEC-026, sistema Trejor): cada placa nos seus 2 consoles CS-1 (concretados com o pilar na face C — CC-1, DEC-031 — ou soldados na obra nas CE-1 das faces laterais), nicho NC-1 nas pontas, folga de 5 mm na junta horizontal (sem empilhar peso), 2 pinos guia PT-1 por junta (só guia, não transmitem esforço) ou trava de pé PT-2 nos pacotes suspensos: ND-LET-PP00.
6. Rev04: sem vigas de travamento VT (só entram com ponte rolante ou carga especificada); o fechamento é isostático (consoles com folga e pinos com furo oblongo vertical) e não é contado no contraventamento — a contribuição medida no modelo global foi desprezível (9,9 → 9,8 mm).
7. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

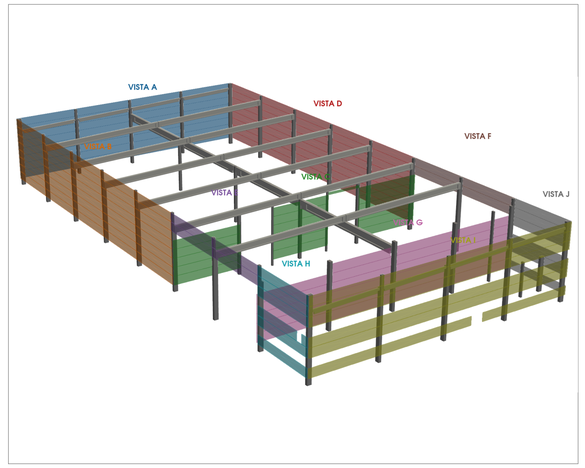

ISOMÉTRICO DO FECHAMENTO — CORES POR PAREDE

placas com transparência de 60 %; pilares e vigas em cinza

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	25/10/2026	DEC-062: CADA PAREDE NA SUA COR (PLANTA E LEGENDA) E ISOMÉTRICO DO FEC
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR (CS-1/CC-1 + CE-1 + NC-1 + PT-1/PT-2); TOLERÂNCIA ±12 (
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; E E F ABERTAS ATÉ +7,50; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACAS 125 × 10; LIGAÇÕES SEM SOLDA; VT DO EIXO A A +6,25; PORTÕES ATÉ
02	12/10/2026	GEOMETRIA DA LOCAÇÃO DO R01; HJ LATERAIS DO ANEXO; E/F ABERTAS ATÉ +7
01	12/10/2026	LOCAÇÃO E VISTAS CONFORME R01 (A–J)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

PLACAS DE FECHAMENTO — LOCAÇÃO CONFORME AS VISTAS DO R01 (A A J), ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS E PENDÊNCIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-CM01	09	01/01	A1

1º DIEDRO
