

LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9 (vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA D — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 40 PEÇAS — 126,4 t

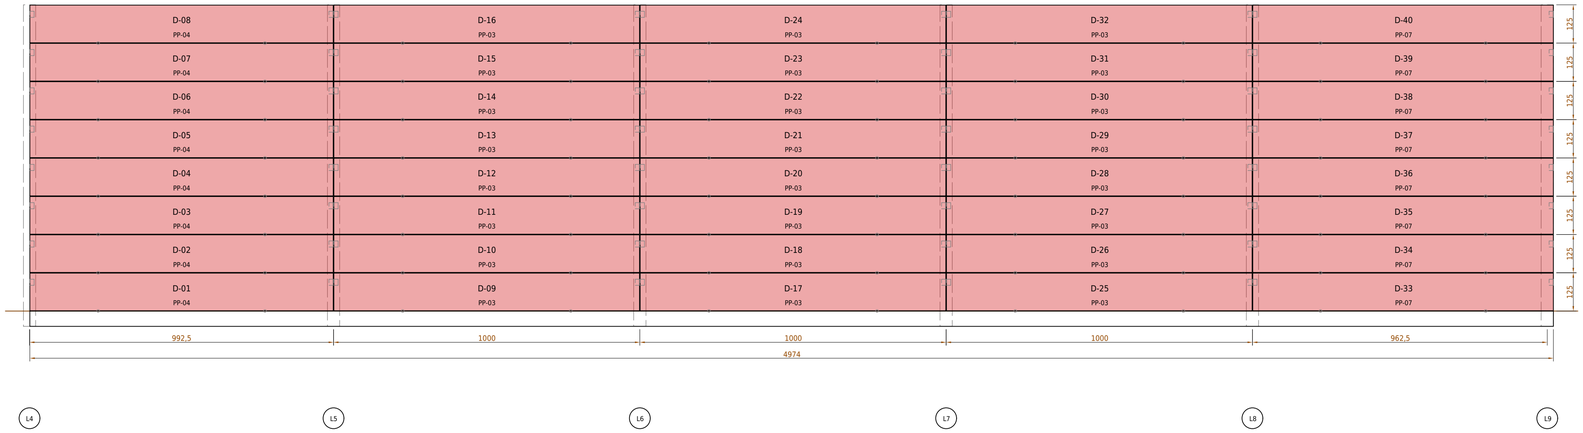


VISTA D — LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9 (VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

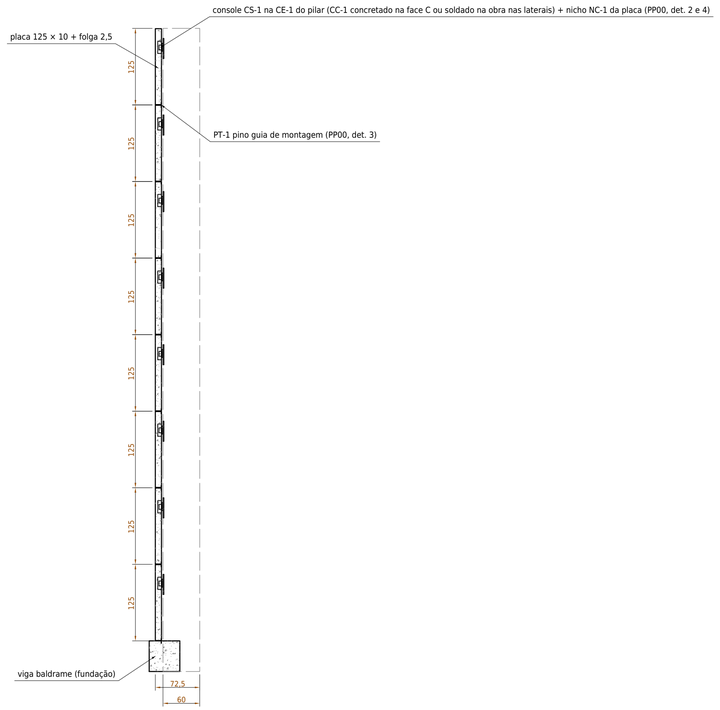

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA D

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)

SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	D-01	PP-04	990,5	+0,00	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	D-02	PP-04	990,5	+1,25	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
3	D-03	PP-04	990,5	+2,50	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
4	D-04	PP-04	990,5	+3,75	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
5	D-05	PP-04	990,5	+5,00	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
6	D-06	PP-04	990,5	+6,25	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
7	D-07	PP-04	990,5	+7,50	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
8	D-08	PP-04	990,5	+8,75	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
9	D-09	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
10	D-10	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
11	D-11	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
12	D-12	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
13	D-13	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
14	D-14	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
15	D-15	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
16	D-16	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
17	D-17	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
18	D-18	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
19	D-19	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
20	D-20	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
21	D-21	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
22	D-22	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
23	D-23	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
24	D-24	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
25	D-25	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
26	D-26	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
27	D-27	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
28	D-28	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
29	D-29	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
30	D-30	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
31	D-31	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
32	D-32	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
33	D-33	PP-07	981,5	+0,00	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
34	D-34	PP-07	981,5	+1,25	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
35	D-35	PP-07	981,5	+2,50	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
36	D-36	PP-07	981,5	+3,75	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
37	D-37	PP-07	981,5	+5,00	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
38	D-38	PP-07	981,5	+6,25	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
39	D-39	PP-07	981,5	+7,50	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
40	D-40	PP-07	981,5	+8,75	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-03	998,0	24	76,2
PP-04	990,5	8	25,2
PP-07	981,5	8	25,0
	total	40	126,4

NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: D-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Consoles da face C dos pilares: já vêm concretados com o pilar (CC-1, DEC-031). Consoles das faces laterais e das paredes internas: antes da placa, soldar o CS-1 na CE-1 no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso de nível M16 (G 51 ± 12 mm); afastamento 25 ± 5 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Pinos guia PT-1: parafusados só no topo da placa de baixo; a placa de cima desce guiada, sem parafuso (não transmitem esforço — DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 10 fios Ø6 CP-175 RB alinhados (5 por face, cobrimento 2,0), 36,6 kN por fio no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 80 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Consoles concretados (CC-1, face C) nesta prancha: 80; soldados na obra (faces laterais): 0 — filete 5 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio.
5. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	25/10/2026	DEC-062: PLACAS NA COR DA PAREDE (VISTA), HACHURA COM 60 % DE TRANSPAR
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CONSOLE CS-1 (CC-1 NA FACE C OU NA CE-1) + NICHO NC-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA D: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-D	09	04/08	A1

1º DIEDRO
