

LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2 · LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2 · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA H E J — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 13 PEÇAS — 37,3 t

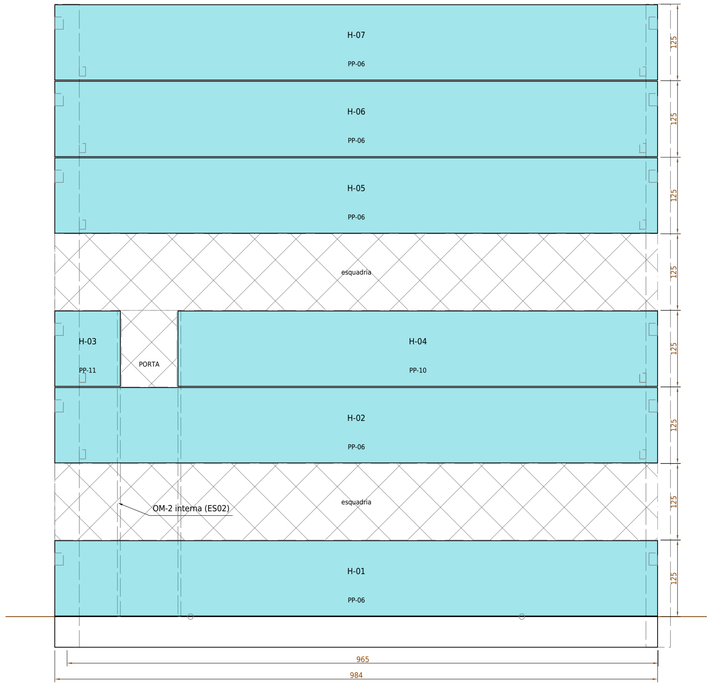


VISTA H — LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

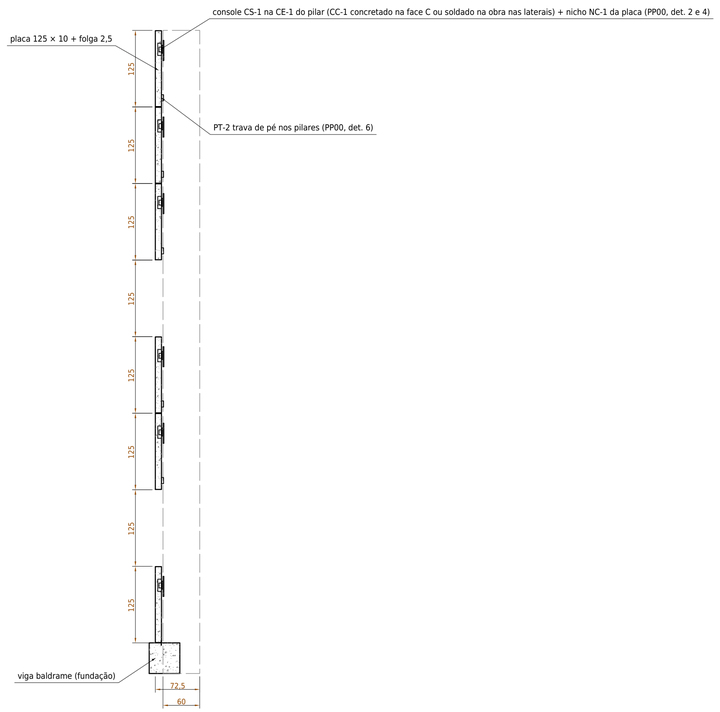


CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA H

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada

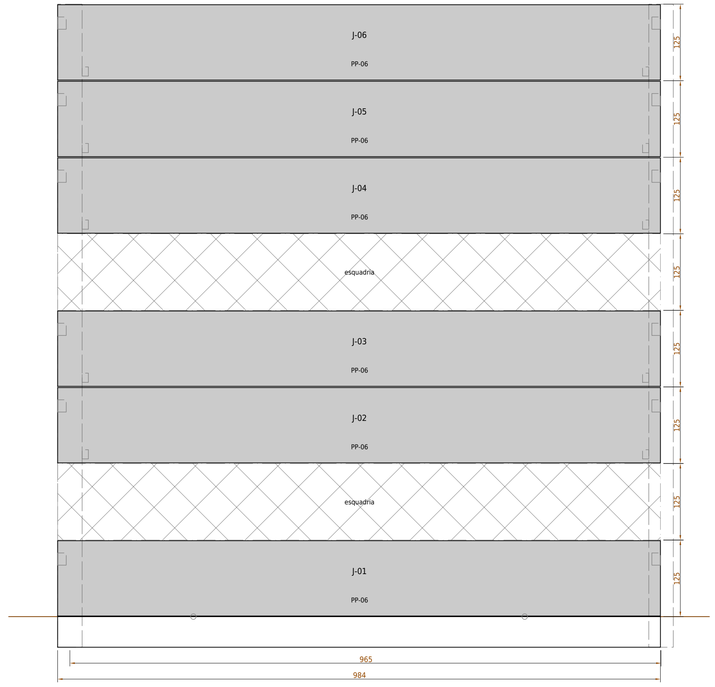

VISTA J — LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)

SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	H-01	PP-06	984,0	+0,00	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	H-02	PP-06	984,0	+2,50	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
3	H-03	PP-11	107,0	+3,75	0,34	CS-1 + console da OM-2 (ombreira interna) + 2 PT-2 (pé)
4	H-04	PP-10	783,0	+3,75	2,49	CS-1 + console da OM-2 (ombreira interna) + 2 PT-2 (pé)
5	H-05	PP-06	984,0	+6,25	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
6	H-06	PP-06	984,0	+7,50	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
7	H-07	PP-06	984,0	+8,75	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
1	J-01	PP-06	984,0	+0,00	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	J-02	PP-06	984,0	+2,50	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
3	J-03	PP-06	984,0	+3,75	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
4	J-04	PP-06	984,0	+6,25	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
5	J-05	PP-06	984,0	+7,50	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
6	J-06	PP-06	984,0	+8,75	3,13	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-06	984,0	11	34,4
PP-10	783,0	1	2,5
PP-11	107,0	1	0,3
	total	13	37,3

NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: H-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Consoles da face C dos pilares: já vêm concretados com o pilar (CC-1, DEC-031). Consoles das faces laterais e das paredes internas: antes da placa, soldar o CS-1 na CE-1 no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso de nível M16 (G 51 ± 12 mm); afastamento 25 ± 5 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Pinos guia PT-1: parafusados só no topo da placa de baixo; a placa de cima desce guiada, sem parafuso (não transmitem esforço — DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 10 fios Ø6 CP-175 RB alinhados (5 por face, cobrimento 2,0), 36,6 kN por fio no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 24 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Consoles concretados (CC-1, face C) nesta prancha: 24; soldados na obra (faces laterais): 0 — filete 5 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio.
5. Faixas hachuradas: esquadrias do anexo (R01), sem placa, de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25; toda placa fica nos seus 2 consoles CS-1, também acima das faixas.
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	25/10/2026	DEC-062: PLACAS NA COR DA PAREDE (VISTA), HACHURA COM 60 % DE TRANSPAR
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CONSOLE CS-1 (CC-1 NA FACE C OU NA CE-1) + NICHO NC-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS H E J: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-HJ	09	07/08	A1

1º DIEDRO
