
FACHADA DA LINHA 1 (anexo, vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA I — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 25 PEÇAS — 75,8 t

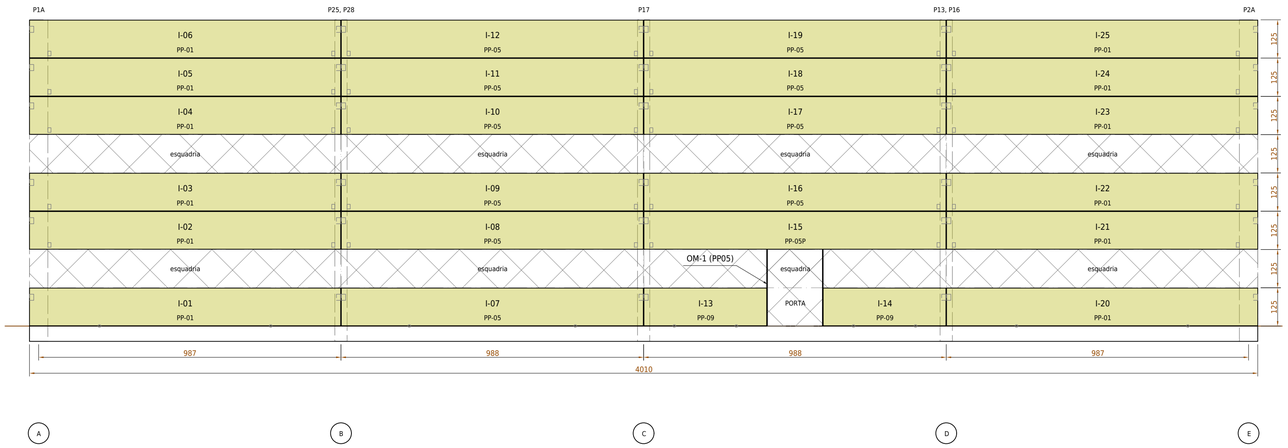

VISTA I — FACHADA DA LINHA 1 (ANEXO, VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	I-01	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	I-02	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
3	I-03	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
4	I-04	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
5	I-05	PP-01	1016,0	+7,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
6	I-06	PP-01	1016,0	+8,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
7	I-07	PP-05	986,0	+0,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
8	I-08	PP-05	986,0	+2,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
9	I-09	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
10	I-10	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
11	I-11	PP-05	986,0	+7,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
12	I-12	PP-05	986,0	+8,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
13	I-13	PP-09	401,0	+0,00	1,28	CS-1 + baldrame + OM-1 + 2 PT-1 (guia)
14	I-14	PP-09	401,0	+0,00	1,28	CS-1 + baldrame + OM-1 + 2 PT-1 (guia)
15	I-15	PP-05P	986,0	+2,50	3,14	2 CS-1 + topo das 2 OM-1 + 2 PT-2 (pé)
16	I-16	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
17	I-17	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
18	I-18	PP-05	986,0	+7,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
19	I-19	PP-05	986,0	+8,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
20	I-20	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
21	I-21	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
22	I-22	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
23	I-23	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
24	I-24	PP-01	1016,0	+7,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)
25	I-25	PP-01	1016,0	+8,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,0	12	38,8
PP-05	986,0	10	31,4
PP-05P	986,0	1	3,1
PP-09	401,0	2	2,6
	total	25	75,8


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: I-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Consoles da face C dos pilares: já vêm concretados com o pilar (CC-1, DEC-031). Consoles das faces laterais e das paredes internas: antes da placa, soldar o CS-1 na CE-1 no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso de nível M16 (G 51 ± 12 mm); afastamento 25 ± 5 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Pinos guia PT-1: parafusados só no topo da placa de baixo; a placa de cima desce guiada, sem parafuso (não transmitem esforço — DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 10 fios Ø6 CP-175 RB alinhados (5 por face, cobrimento 2,0), 36,6 kN por fio no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 48 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Consoles concretados (CC-1, face C) nesta prancha: 36; soldados na obra (faces laterais): 12 — filete 5 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio.
5. Faixas hachuradas: esquadrias do anexo (R01), sem placa, de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25; toda placa fica nos seus 2 consoles CS-1, também acima das faixas. Porta: 180 × 250 (a confirmar); as placas ao lado da porta têm console só na ponta do pilar e apoiam no baldrame / na placa de baixo do lado da porta.
6. DEC-044 — CS-1C (12 nesta prancha): CS-1 com calço de 100 mm, soldado na fábrica, nos pilares cuja face fica 100 mm atrás do plano dos consoles (P1A, P2A) — ND-LET-PP06.
7. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

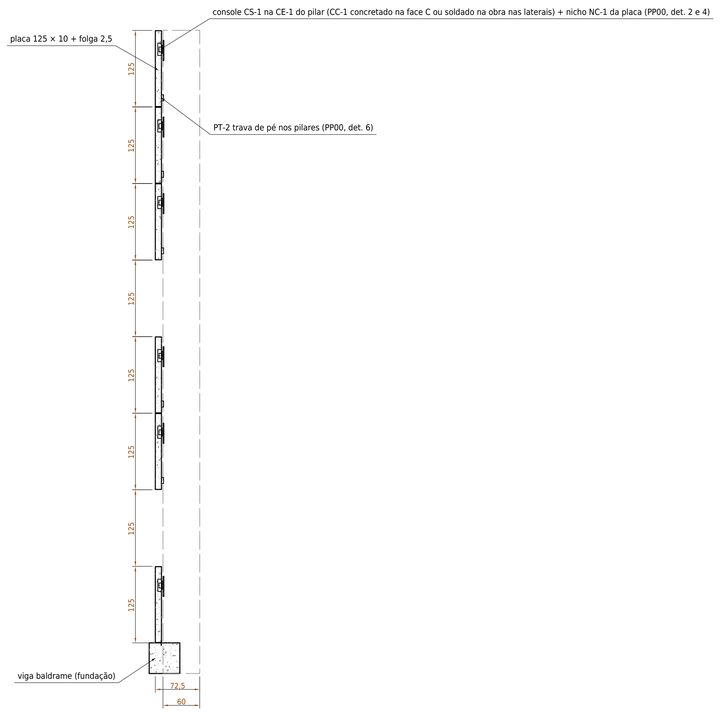

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA I

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	25/10/2026	DEC-062: PLACAS NA COR DA PAREDE (VISTA), HACHURA COM 60 % DE TRANSPAR
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CONSOLE CS-1 (CC-1 NA FACE C OU NA CE-1) + NICHO NC-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA I: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-PP-I	09	08/08	A1

1º DIEDRO
