
locação das vistas; cada vista tem a sua prancha de produção e montagem (ND-LET-PP-A a PP-I); placa típica na ND-LET-PP00

CM PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 203 PEÇAS · 14 TIPOS · 10 VISTAS · 619 t

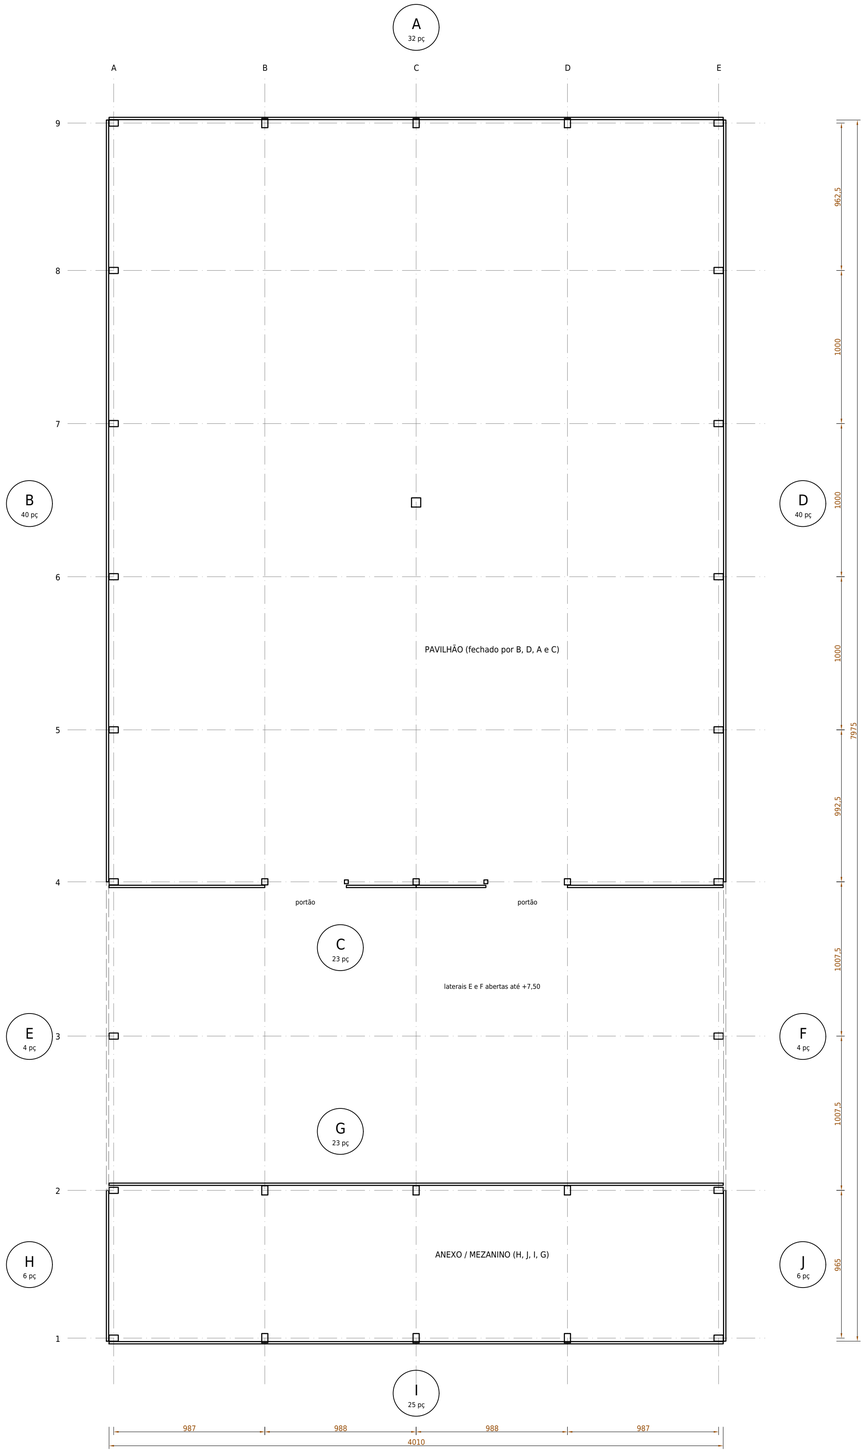


PLANTA DE LOCAÇÃO DAS PLACAS

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — letras = vistas do R01; pç = peças da vista

ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS

| ORD. | VISTA | PAREDE | PEÇAS | PESO (t) | PRANCHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | PAREDE INTERNA DA LINHA 4 | 23 | 52,7 | ND-LET-PP-C |
| 2 | G | PAREDE INTERNA DA LINHA 2 | 23 | 73,0 | ND-LET-PP-G |
| 3 | I | FACHADA DA LINHA 1 | 25 | 75,8 | ND-LET-PP-I |
| 4 | H | LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2 | 6 | 18,8 | ND-LET-PP-HJ |
| 5 | J | LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2 | 6 | 18,8 | ND-LET-PP-HJ |
| 6 | E | LATERAL DO EIXO A, LINHAS 2 A 4 | 4 | 12,8 | ND-LET-PP-EF |
| 7 | F | LATERAL DO EIXO E, LINHAS 2 A 4 | 4 | 12,8 | ND-LET-PP-EF |
| 8 | B | LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9 | 40 | 126,4 | ND-LET-PP-B |
| 9 | D | LATERAL DO EIXO E, LINHAS 4 A 9 | 40 | 126,4 | ND-LET-PP-D |
| 10 | A | FACHADA DA LINHA 9 | 32 | 101,9 | ND-LET-PP-A |
| | | total | 203 | 619,3 | |

TIPOS × VISTAS

| TIPO | L (cm) | QT | VISTA: QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| PP-01 | 1016,0 | 50 | A: 16 C: 11 G: 11 I: 12 |
| PP-02 | 1005,5 | 8 | E: 4 F: 4 |
| PP-03 | 998,0 | 48 | B: 24 D: 24 |
| PP-04 | 990,5 | 16 | B: 8 D: 8 |
| PP-05RD | 986,0 | 1 | G: 1 |
| PP-05RE | 986,0 | 1 | G: 1 |
| PP-05P | 986,0 | 1 | I: 1 |
| PP-05 | 986,0 | 36 | A: 16 G: 10 I: 10 |
| PP-06 | 984,0 | 12 | H: 6 J: 6 |
| PP-07 | 981,5 | 16 | B: 8 D: 8 |
| PP-08RD | 453,5 | 1 | C: 1 |
| PP-08RE | 453,5 | 1 | C: 1 |
| PP-08 | 453,5 | 10 | C: 10 |
| PP-09 | 401,0 | 2 | I: 2 |

NOTAS

1. Geometria pela PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DE PILARES do R01: eixos A–E a 9,87 / 9,88 / 9,88 / 9,87 m; linhas 1–9 a 9,65 / 10,075 / 10,075 / 9,925 / 10,00 / 10,00 / 10,00 / 9,625 m (79,35 m entre eixos).
2. Vistas como no R01: B e D (linhas 4–9) fechadas, 8 fiadas; E (eixo A) e F (eixo E), linhas 2–4, só as 2 fiadas de cima (rev04, sem VT); H, J (anexo) e I (fachada da linha 1) com faixas de esquadria de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25 e porta na I; A (linha 9) fechada.
3. Paredes internas C (linha 4) e G (linha 2) com placas até +7,50 (vão A–B até +6,25: a viga de cobertura desce a +7,19 junto ao eixo A); acima, até a telha, fechamento metálico leve — confirmar com o cliente.
4. Linha 4: 2 portões (P26–P19, P21 e P19, P21–P15), livres até +7,40 (topo do P26), sob a viga de cobertura; o trecho P19, P21–P20–P19, P21 é fechado.
5. Placas 125 × 10 (rev03) por fora dos pilares (folga 25 mm), juntas verticais de 20 mm no eixo dos pilares (rev04; tolerância de comprimento da placa ±5 mm); rev06 (DEC-026, sistema Trejor): cada placa nos seus 2 consoles CS-1 (concretados com o pilar na face C — CC-1, DEC-031 — ou soldados na obra nas CE-1 das faces laterais), nicho NC-1 nas pontas, folga de 5 mm na junta horizontal (sem empilhar peso), 2 pinos guia PT-1 por junta (só guia, não transmitem esforço) ou trava de pé PT-2 nos pacotes suspensos: ND-LET-PP00.
6. Rev04: sem vigas de travamento VT (só entram com ponte rolante ou carga especificada); o fechamento é isostático (consoles com folga e pinos com furo oblongo vertical) e não é contado no contraventamento — a contribuição medida no modelo global foi desprezível (9,9 → 9,8 mm).
7. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 08 | 23/10/2026 | REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN |
| 07 | 21/10/2026 | EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM |
| 06 | 17/10/2026 | FIXAÇÃO TREJOR (CS-1/CC-1 + CE-1 + NC-1 + PT-1/PT-2); TOLERÂNCIA ±12 ( |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM VT; E E F ABERTAS ATÉ +7,50; JUNTA VERTICAL 20 mm |
| 03 | 14/10/2026 | PLACAS 125 × 10; LIGAÇÕES SEM SOLDA; VT DO EIXO A A +6,25; PORTÕES ATÉ |
| 02 | 12/10/2026 | GEOMETRIA DA LOCAÇÃO DO R01; HJ LATERAIS DO ANEXO; E/F ABERTAS ATÉ +7 |
| 01 | 12/10/2026 | LOCAÇÃO E VISTAS CONFORME R01 (A–J) |

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

PLACAS DE FECHAMENTO — LOCAÇÃO CONFORME AS VISTAS DO R01 (A A J), ORDEM DE MONTAGEM DAS VISTAS E PENDÊNCIAS

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| 1:200 | 23/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FÓLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-CM01 | 08 | 01/01 | A1 |

1º DIEDRO
