
POSIÇÃO: eixo A (P1), linhas 5 a 8 · PESO 6,12 t · VOLUME 2,45 m³ · FACES: A = consolo (interna), B = lado de 40 (y+), C = placas (externa), D = lado de 40 (y−) · desenhado em pé, como montado; demais marcas: tabela e planta-chave

PL-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 x 60 cm (cabeça 40 x 30) · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 4 peças

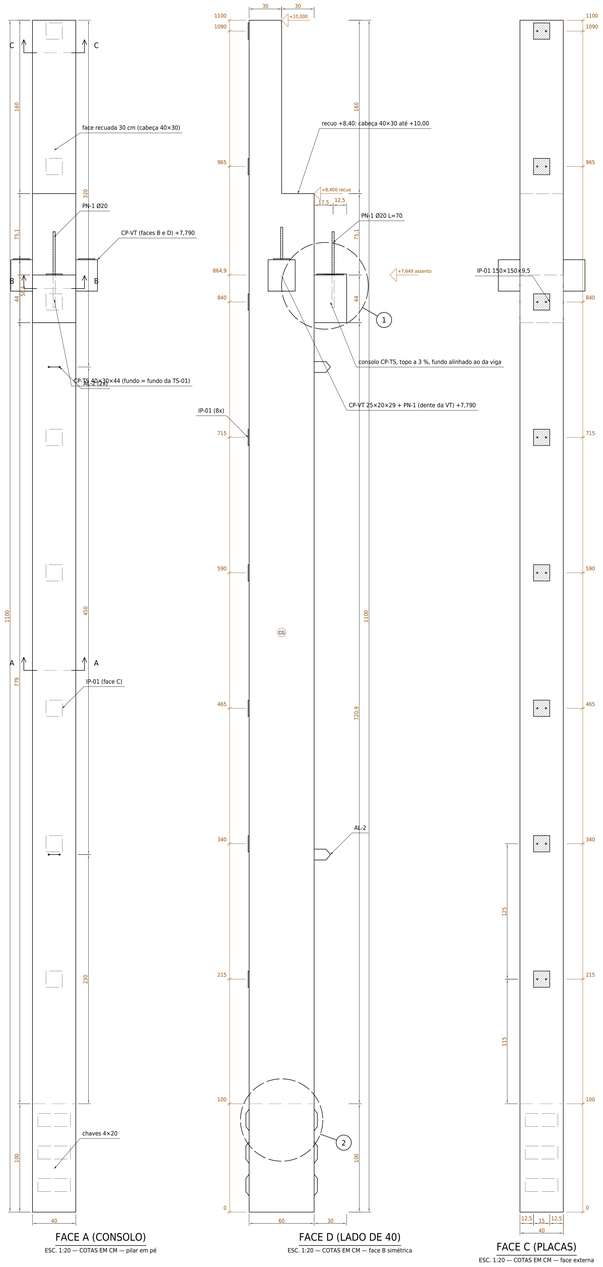

FACE A (CONSOLO)


ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE D (LADO DE 40)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face B simétrica


FACE C (PLACAS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face externa




ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 11 marcas



PLANTA-CHAVE — LOCAÇÃO DOS PILARES 40×60


ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-01 hachurado



ISOMÉTRICO


faces B e C; sem escala

projeto da ND Engenharia

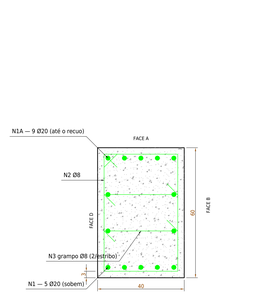


CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm




CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — no consolo




CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça 40×30 (acima do recuo)

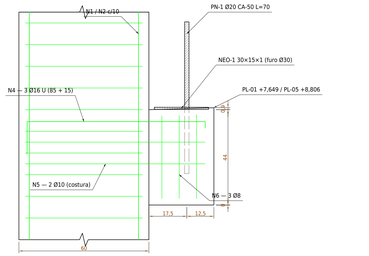


DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta); NBR 9062:2017 7.3




DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves

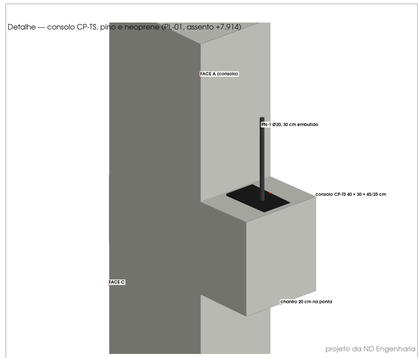

ISOMÉTRICO — CONSOLO CP-TS

sem escala



DETALHE 3 — INSERTO IP-01

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa A36 + 2 pinos c/ cabeça

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento, face)	INSERTOS DE PLACA
PL-01	P1 L5-L8	4	recuo +7,20	8 CE-1 (C)
PL-09	P1 L3	1	recuo +7,20	2 CE-1 (C, fiadas 6-7)
PL-10	P1 L4	1	recuo +7,20	8 CE-1 (C) + 5 (B, vista C)
PL-02	P1 L2	1	2 CP-MEZ (A); recuo +7,20	6 CE-1 (C) + 5 (B, vista G)
PL-03	P1 L1 canto	1	CP-VB +7,798 (A); 2 CP-MEZ (A); recuo A e B	6 CE-1 (C) + 6 (D)
PL-04	P1 L9 canto	1	CP-VB +7,798 (A); recuo A e D	8 CE-1 (C) + 8 (B)
PL-05	P2 L5-L8	4	recuo +8,37	8 CE-1 (C)
PL-11	P2 L3	1	recuo +8,37	2 CE-1 (C, fiadas 6-7)
PL-12	P2 L4	1	recuo +8,37	8 CE-1 (C) + 6 (D, vista C)
PL-06	P2 L2	1	2 CP-MEZ (A); recuo +8,37	6 CE-1 (C) + 6 (D, vista G)
PL-07	P2 L1 canto	1	CP-VB +8,957 (A); 2 CP-MEZ (A); recuo A e D	6 CE-1 (C) + 6 (B)
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,957 (A); recuo A e B	8 CE-1 (C) + 8 (D)
PF-01	P3 L1	1	CP-VB +8,071 (B); CP-VB +8,091 (D); 4 CP-MEZ (B, D); recuo +8,40	6 CE-1 (C)
PF-02	P4 L1	1	CP-VB +8,367 (B); CP-VB +8,388 (D); 4 CP-MEZ (B, D); recuo +8,70	6 CE-1 (C)
PF-03	P5 L1	1	CP-VB +8,664 (B); CP-VB +8,684 (D); 4 CP-MEZ (B, D); recuo +9,00	6 CE-1 (C)
PF-05	P3 L9	1	CP-VB +8,091 (B); CP-VB +8,071 (D); recuo +8,40	8 CE-1 (C)
PF-04	P14 L9	1	CP-VB +8,388 (B); CP-VB +8,367 (D); CP-I-130 +6,966 (A); recuo +8,70	8 CE-1 (C)
PF-06	P5 L9	1	CP-VB +8,684 (B); CP-VB +8,664 (D); recuo +9,00	8 CE-1 (C)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	5	1092	1092	54,60	134,6
N1A	20	9	947	15 / 932	85,23	210,2
N7	16	4	228	72 / 216	9,12	14,4
N8	8	15	132	34 / 24 □ 24 / 34	19,80	7,8
N9	12,5	2	60	60	1,20	1,2
N2	8	72	192	34 / 54 □ 54 / 34	138,24	54,6
N3	8	144	50	34 / 8 □ 8	72,00	28,4
N4	16	3	228	82 / 15 □ 34	6,84	10,8
N5	10	2	248	82 / 34 □ 34	4,96	3,1
N6	8	3	160	82 / 34 / 38 □ 38 / 34	4,80	1,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	234,84	102,0
CA-50	10	4,96	3,4
CA-50	12,5	1,20	1,3
CA-50	16	15,96	27,7
CA-50	20	139,83	379,3
		TOTAL (kg)	513,7

INSERTOS POR PILAR (PL-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo), a 175 mm da face	3	CP-TS (face A) e 2 CP-VT (faces B e D)
CP-VT	Consolo 25×20×29 sem chanfro p/ dente da VT 25×60 (+7,790)	2	faces B e D (canto; 1)
IP-01	Chapa A36 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01)	8	face C, c/1250 a partir do piso
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), carga 40 kN	2	face A: 3200 do topo; 2300 da base
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem)	1	sobre o consolo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PL-01	SEÇÃO	40 × 60 (cabeça 40 × 30)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,45 m³	PESO	6,12 t
AÇO CA-50	514 kg	TAXA	1,83 %
PROTENSÃO	—	CG	5,50 m da base
QUANTIDADE	4 (família: 24)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

——— longitudinal (barras N, tirantes, pele)

——— transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40. Barras longitudinais retas de ponta a ponta (sem emenda); nenhuma bitola acima de Ø20.
2. Cobrimento nominal 3,0 cm aos estribos (NBR 6118:2023 Tab. 7.2, CA II); espaçadores plásticos a cada 100 cm nas 4 faces.
3. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135° (8 cm), c/15 no trecho corrente e c/10 nos 150 cm junto ao topo e no cálice; 2 grampos N3 Ø8 por estribo nas linhas a 8,4 cm do eixo (NBR 6118:2023 18.4.3).
4. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, para o fundo do consolo ficar alinhado com o fundo da viga (CP-TS 44, CP-MEZ 44, CP-VB 29, CP-VT 29 cm). CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6 (NBR 9062:2017 7.3); posição e face por marca na tabela. Consolos CP-VT (2 Ø12,5 tirante + 2 estribos Ø8) nas faces B e D em +7,790 para os dentes das vigas de travamento VT 25×60 (+7,50/+8,10, ND-LET-VT01).
5. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste 82 kN ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 Ø50×3,0 da viga (furo 44), grauteado nunca ponta só de cada viga.
6. CABEÇA RECUADA: acima de +8,40 (PL-01 a PL-04; +9,55 em PL-05 a PL-08; fachada: topo da VB) o pilar segue só com os 30 cm do lado das placas (40×30) até +10,00; N1A param no recuo com gancho; N7 (4 Ø16) ancoram 60 cm no corpo; N8 Ø8 c/10 na cabeça; 2 N9 Ø12,5 a 45° no canto reentrante. Fôrma: tampa de 30 cm na face A acima do recuo.
7. Faces: A = consolo (interna), B e D = lados de 40, C = placas (externa). Pilar concretado deitado com a face C (placas, CC-1) para cima e a face A no fundo da fôrma (DEC-031).
8. Insertos IP-01 na face C a cada fiada de placa (125 cm a partir do piso); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
9. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
10. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	12/10/2026	CONSOLOS SEM CHANFRO; FUNDO ALINHADO AO FUNDO DAS VIGAS (ALTURA = RECO
04	12/10/2026	GEOMETRIA DO RECUO; CABEÇA RECUADA 40×30 ACIMA DE +8,40 (APROVADO); VT E
03	12/10/2026	CONSOLOS CP-VT (DENTES DAS VIGAS DE TRAVAMENTO +6,25/+6,85) NAS FACES
02	12/10/2026	PILAR DESENHADO EM PÉ (POSIÇÃO DE MONTAGEM); CHAPARIA HACHURADA; DETAL
01	12/10/2026	VISTAS DAS FACES A/B/C, ISOMÉTRICOS, PLANTA-CHAVE, COTAS EM CM, ESTRIB
00	12/10/2026	EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B)

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO A (ARMADO)

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-01	4	61,2	2,45

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-01 (FAMÍLIA PL-01 A PF-03) 40×60 — CONCRETO ARMADO — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PIL-A01	05	01/01	A0

1º DIEDRO
