
POSIÇÃO: P7 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · PESO 6,11 t · VOLUME 2,44 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

P7 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 PEÇA




ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

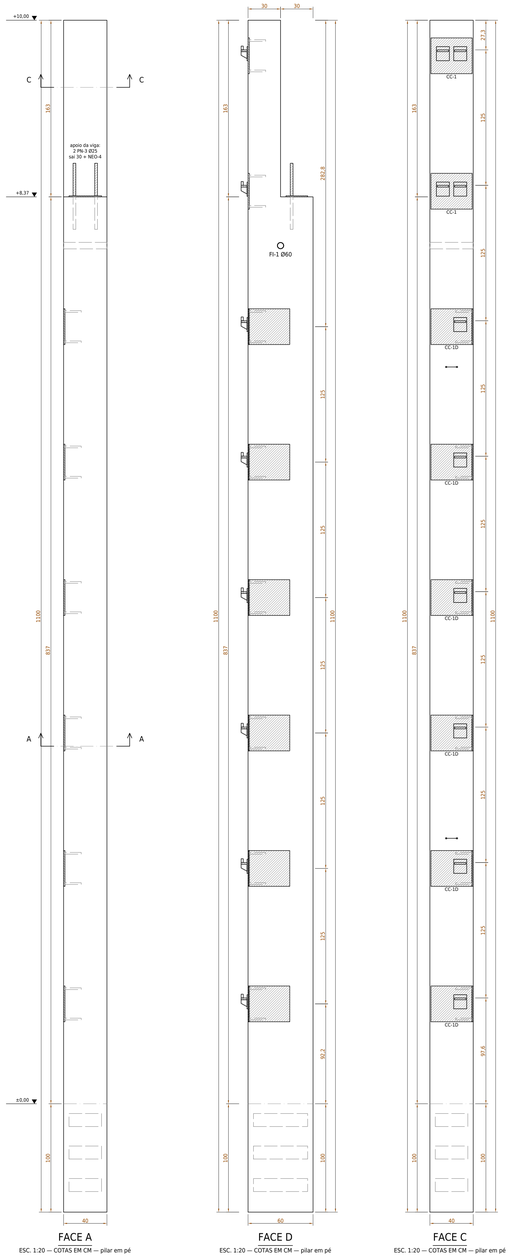


PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas




CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)




CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada (fôrma)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



FUNDO DA FÔRMA
cabeça: calço 30 cm no fundo

POSIÇÃO NA FÔRMA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima

ARMAÇÃO — P7 — 1 UNIDADE

P7 (eixo E); cabeça 40 × 30 acima de +8,37 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)



SEÇÃO S.1

SEÇÃO S.2 (CABEÇA)

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	5	1092	5460
CA-50	N1A	16	7	945	6615
CA-50	N13	10	5	239	1195
CA-50	N14	6,3	15	132	1980
CA-50	N2	6,3	72	192	13824
CA-50	N3	6,3	72	50	3600
CA-50	N3A	6,3	72	70	5040
CA-50	N18	10	28	96	2688

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	268,88 m	65,88 kg
PESO CA-50 Ø 10	42,71 m	26,35 kg
PESO CA-50 Ø 16	132,83 m	209,60 kg
PESO TOTAL CA-50		301,83 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,44 m³
ÁREA DE FÔRMA = 21,38 m²

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P7	P7	1	recuo +8,37	8 CC-1 (C) + 6 (D, vista C)

INSERTOS POR PILAR (P7) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
CC-1	CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado)	8	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
CE-1	CE-1 380×330×12,5 + 4 pinos + 2 N18 (CS-1 na obra)	6	face D, centro 92 acima da fiada, vista C
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à D, pacotes suspensos
PN-3	Pino Ø25 CA-50 L=600 (300 no pilar)	2	assento da viga de cobertura, y ±100, 102,5 da cabeça
NEO-4	Neoprene 200×300×10 com 2 furos Ø35	1	assento horizontal da viga de cobertura, de 50 a 250 mm da cabeça
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face C: 320 do topo, 345 da base
Fi-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 208 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P7	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,44 m³	PESO	6,11 t
AÇO CA-50	302 kg	TAXA	1,01 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +8,37		

LEGENDA DAS ARMADURAS


- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø16 longitudinais (5 em cada face de 40 e 3 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6.3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 2 grampos por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + Rayleigh (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais, manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I/30 49, CP-V/8 29 cm (dente 30 da V8 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ ℓ + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d. nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +8,37 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda. O degrau do recuo é o ASSENTO DA vigas de cobertura: topo HORIZONTAL (NBR 9062:2017 7.2.1.6; a cunha no fundo da ponta da viga de cobertura deixa a face de apoio horizontal), neoprene NEO-4 200×300×10 e 2 pinos PN-3 Ø25 a 10,25 cm da cabeça, graduados nos tubos da viga: apoio útil de 27,5 cm.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D rente e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em cavão no fundo; calço de 30 cm no fundo sob a cabeça recuada. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; N3-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o console — DEC-042), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consoles CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consoles; CC-1/ECC-10 com 1, nas pontas de parede) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pelo gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP01/PP04). Nas fiadas de parede suspensa (E.F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face B: lisa (só as chaves do cálice).
7. CABEÇA (platibanda, DEC-042): balanço de 163 cm acima do recuo, dimensionado para o vento nas placas da platibanda (sucção e sobrepressão nos consoles das fiadas acima do recuo, cp 1,6) e o peso das placas excêntrico: Md = 44,1 kN·m (tração na face do recuo). Armadura: as barras do corpo da fiseira da face C sobem até o topo; N13 5·Ø10 próprias da cabeça (5 junto à face do recuo), ancoradas 80 cm no corpo (trasp asse NBR 6118:2023 9.5.2.2, αb 2,0, má aderência). Alças AL-2 e furo Fi-1 no corpo, fora da platibanda.
8. Desformar, bascular e transportar só com fc ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo Fi-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
9. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C); tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
10. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

PL-12 — faces C e B

PL-12 — faces A e D

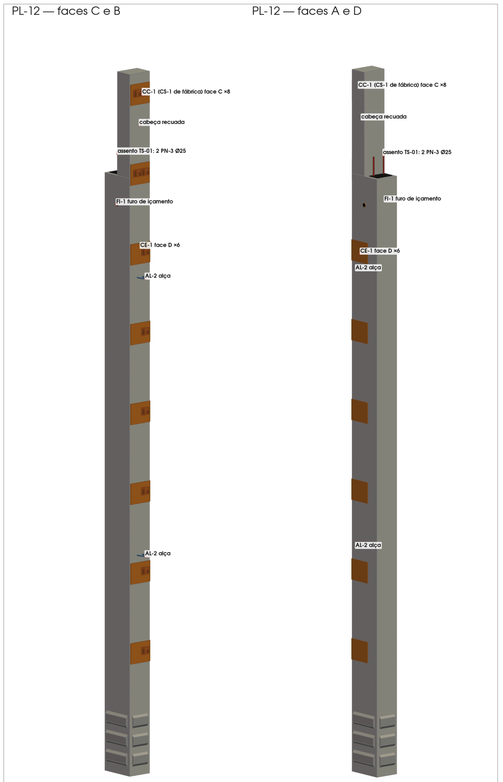

ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: CABEÇA COM ARMADURA PRÓPRIA (N13 POR TRASPASSE); PLANTA-CHAVE
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CS-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4683 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-3
ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P7	1	61,1	2,44

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO P7 (FAMÍLIA 40×60) — P7 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PL12	10	01/01	A0
