
FACHADA DA LINHA 9 (vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA A — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 32 PEÇAS — 101,9 t

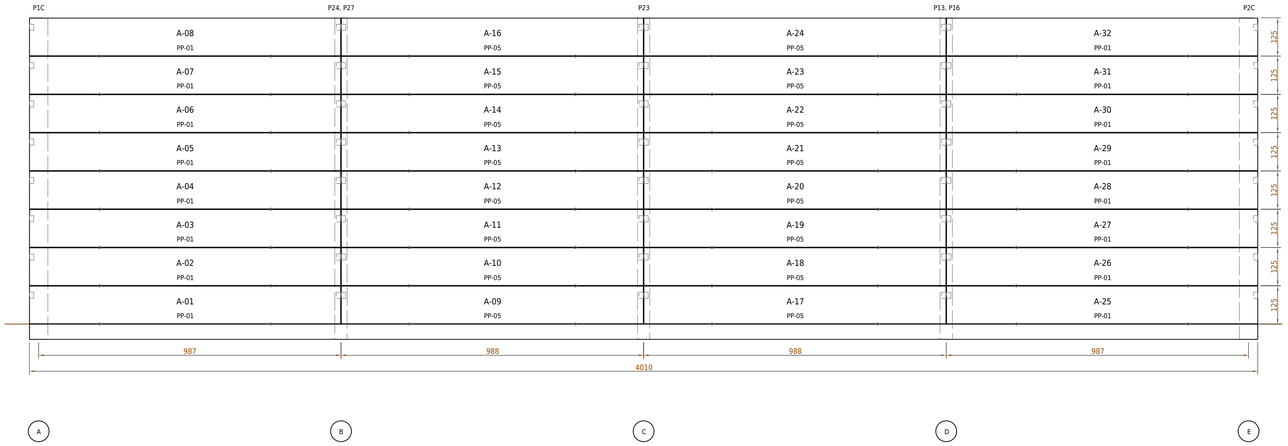

VISTA A — FACHADA DA LINHA 9 (VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	A-01	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	A-02	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
3	A-03	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
4	A-04	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
5	A-05	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
6	A-06	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
7	A-07	PP-01	1016,0	+7,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
8	A-08	PP-01	1016,0	+8,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
9	A-09	PP-05	986,0	+0,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
10	A-10	PP-05	986,0	+1,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
11	A-11	PP-05	986,0	+2,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
12	A-12	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
13	A-13	PP-05	986,0	+5,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
14	A-14	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
15	A-15	PP-05	986,0	+7,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
16	A-16	PP-05	986,0	+8,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
17	A-17	PP-05	986,0	+0,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
18	A-18	PP-05	986,0	+1,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
19	A-19	PP-05	986,0	+2,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
20	A-20	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
21	A-21	PP-05	986,0	+5,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
22	A-22	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
23	A-23	PP-05	986,0	+7,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
24	A-24	PP-05	986,0	+8,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
25	A-25	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
26	A-26	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
27	A-27	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
28	A-28	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
29	A-29	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
30	A-30	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
31	A-31	PP-01	1016,0	+7,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
32	A-32	PP-01	1016,0	+8,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,0	16	51,7
PP-05	986,0	16	50,2
	total	32	101,9


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: A-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Consoles da face C dos pilares: já vêm concretados com o pilar (CC-1, DEC-031). Consoles das faces laterais e das paredes internas: antes da placa, soldar o CS-1 na CE-1 no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso de nível M16 (G 51 ± 12 mm); afastamento 25 ± 5 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Pinos guia PT-1: parafusados só no topo da placa de baixo; a placa de cima desce guiada, sem parafuso (não transmitem esforço — DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 10 fios Ø6 CP-175 RB alinhados (5 por face, cobrimento 2,0), 36,6 kN por fio no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 64 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Consoles concretados (CC-1, face C) nesta prancha: 48; soldados na obra (faces laterais): 16 — filete 5 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio.
5. DEC-044 — CS-1C (16 nesta prancha): CS-1 com calço de 100 mm, soldado na fábrica, nos pilares cuja face fica 100 mm atrás do plano dos consoles (P1C, P2C) — ND-LET-PP06.
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

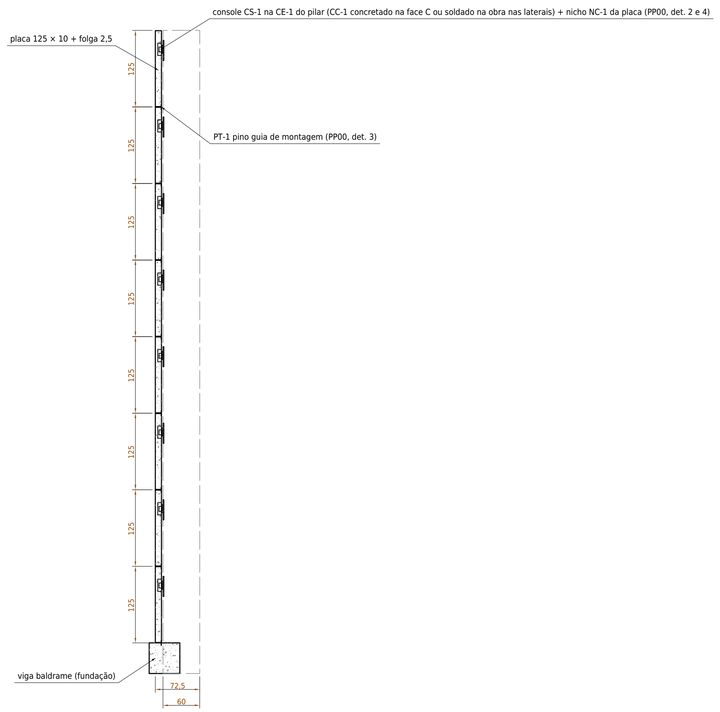

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA A

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CONSOLE CS-1 (CC-1 NA FACE C OU NA CE-1) + NICHO NC-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA A: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-PP-A	08	01/08	A1

1º DIEDRO
