
PAREDE INTERNA DA LINHA 4 (PORTÕES) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA C — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 23 PEÇAS — 52,7 t

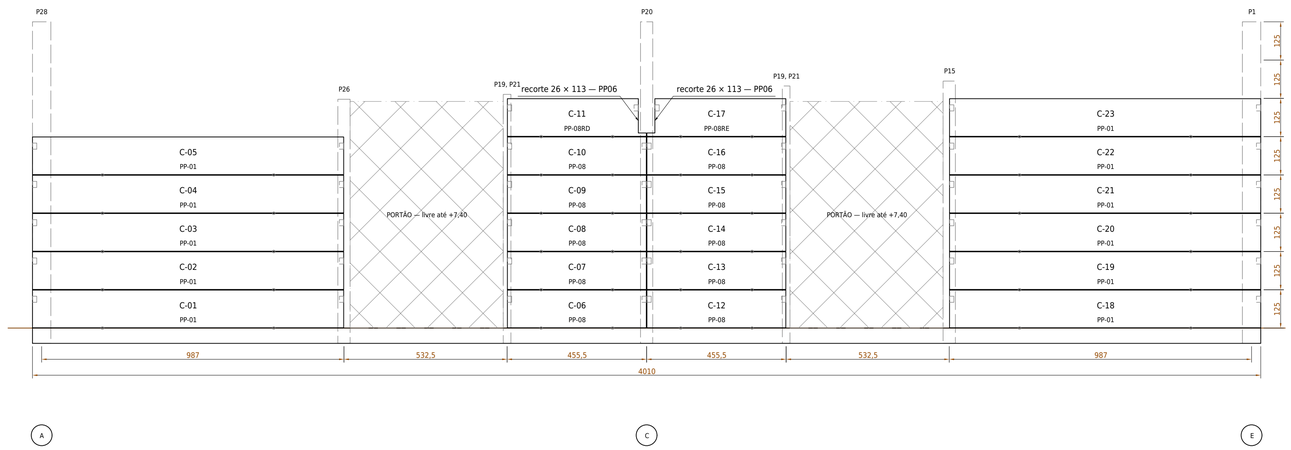

VISTA C — PAREDE INTERNA DA LINHA 4 (PORTÕES)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	C-01	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
2	C-02	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
3	C-03	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
4	C-04	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
5	C-05	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
6	C-06	PP-08	453,5	+0,00	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
7	C-07	PP-08	453,5	+1,25	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
8	C-08	PP-08	453,5	+2,50	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
9	C-09	PP-08	453,5	+3,75	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
10	C-10	PP-08	453,5	+5,00	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
11	C-11	PP-08RD	453,5	+6,25	1,37	2 CS-1 (ponta recortada: CS-1 na CE-1L) + 2 PT-1 (guia)
12	C-12	PP-08	453,5	+0,00	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
13	C-13	PP-08	453,5	+1,25	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
14	C-14	PP-08	453,5	+2,50	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
15	C-15	PP-08	453,5	+3,75	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
16	C-16	PP-08	453,5	+5,00	1,44	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
17	C-17	PP-08RE	453,5	+6,25	1,37	2 CS-1 (ponta recortada: CS-1 na CE-1L) + 2 PT-1 (guia)
18	C-18	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
19	C-19	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
20	C-20	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
21	C-21	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
22	C-22	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)
23	C-23	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (guia)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,0	11	35,5
PP-08	453,5	10	14,4
PP-08RD	453,5	1	1,4
PP-08RE	453,5	1	1,4
	total	23	52,7


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: C-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Consoles da face C dos pilares: já vêm concretados com o pilar (CC-1, DEC-031). Consoles das faces laterais e das paredes internas: antes da placa, soldar o CS-1 na CE-1 no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso de nível M16 (G 51 ± 12 mm); afastamento 25 ± 5 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Pinos guia PT-1: parafusados só no topo da placa de baixo; a placa de cima desce guiada, sem parafuso (não transmitem esforço — DEC-035). Nas placas de pacote suspenso, apertar as 2 travas PT-2 no pé antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 10 fios Ø6 CP-175 RB alinhados (5 por face, cobrimento 2,0), 36,6 kN por fio no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 46 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Consoles concretados (CC-1, face C) nesta prancha: 0; soldados na obra (faces laterais): 46 — filete 5 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio.
5. Placas até +7,50 (vão A–P26 até +6,25: a viga de cobertura desce até +7,19 junto ao eixo A); acima, até a telha, fechamento metálico leve na face da viga de cobertura. Portões P26–P19, P21 e P19, P21–P15 livres até +7,40 (topo do P26).
6. DEC-044 — C-11, C-17 (PP-08RD, PP-08RE): recorte de 26 × 113 cm na ponta do eixo C (o consolo CP-I130 e o nariz do I130 atravessam a parede); o console CS-1 dessa ponta fica a 33 cm da ponta, numa CE-1L (840 × 330) no pilar P20 — fôrma, armação e CE-1L na ND-LET-PP06.
7. DEC-044 — CS-1D (12 nesta prancha): CS-1 com calço de 75 mm, soldado na fábrica, nos pilares cuja face fica 75 mm atrás do plano dos consoles (P19, P21) — ND-LET-PP06.
8. Cotas de concreto em cm, níveis em m. Não medir no desenho.

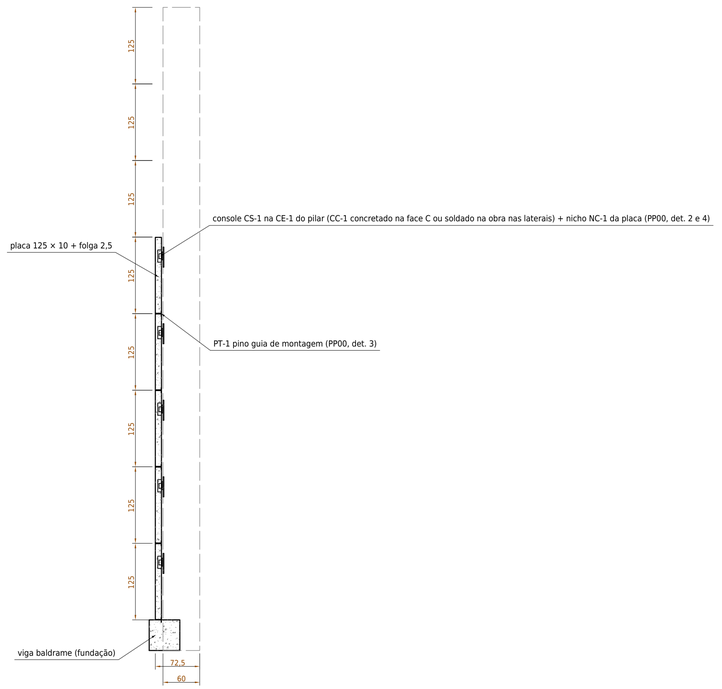

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA C

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CONSOLE CS-1 (CC-1 NA FACE C OU NA CE-1) + NICHO NC-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA C: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FÓLHA	FORMATO
ND-LET-PP-C	08	03/08	A1

1º DIEDRO
