
POSIÇÃO: P2 L9 canto (eixo E); cabeça 30 × 30 acima de +9,30 · PESO 6,37 t · VOLUME 2,55 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado


PL-08

PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 30 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 peça




FACE A (CONSOLES)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé




FACE D

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé




FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé





ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A




ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-08 hachurado

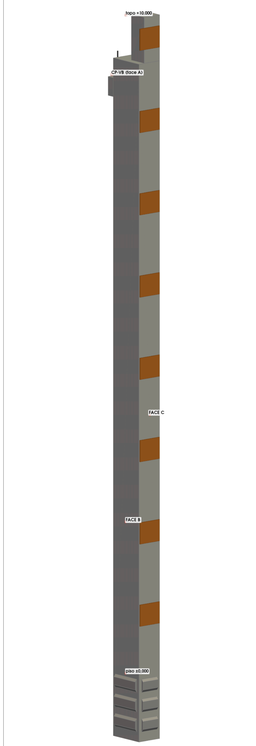




ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm




ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada

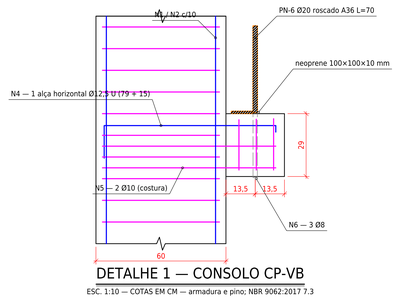


DETALHE 1 — CONSOLO CP-VB

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves

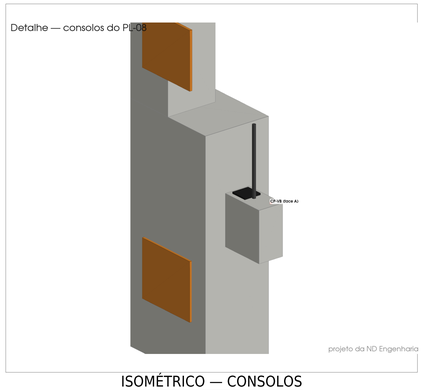

ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,957 (A); recuo A e B	8 CE-1 (C) + 8 (D)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	3	1092	1092	32,76	80,8
N1A	20	11	1038	1023 + 15	114,18	281,6
N13	16	5	126	126	6,30	9,9
N14	8	6	112	24 / 34	6,72	2,7
N2	8	81	192	54 / 34	155,52	61,4
N3	8	162	50	8 / 34 / 8	81,00	32,0
N18	10	32	96	45 / 6 / 45	30,72	19,0
N4	12,5	2	197	15 / 79 / 9	3,94	3,8
N5	10	2	192	9 / 79	3,84	2,4
N6	8	3	80	23 / 9	2,40	0,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	245,64	106,7
CA-50	10	34,56	23,5
CA-50	12,5	3,94	4,2
CA-50	16	6,30	10,9
CA-50	20	146,94	398,6
		TOTAL (kg)	543,9

INSERTOS POR PILAR (PL-08) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-6	Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo)	1	CP-VB
NEO-6	Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB)	1	CP-VB
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 grampos N18	8	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
CE-1	CE-1 380×330×16 + 4 pinos Ø16 + 2 grampos N18	8	face D, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PT-2)	—	laterais junto à D, pacotes suspensos
ES-1F2	2 barras roscadas M20 A36 L=520 c/ gancho (ST-1F da última torre da LT)	2	topo do cuo, x = −22,3 e −16,3 cm do eixo E, no eixo da linh
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face A: 320 cm do topo e 230 cm da base

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PL-08	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,55 m³	PESO	6,37 t
AÇO CA-50	544 kg	TAXA	1,83 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	30 × 30 cm acima de +9,30		

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; armação igual à do PL-01 (ND-LET-PIL-A01): 14 Ø20 retos (N1 sobem até o topo só na fileira da face C; N1A param no recuo com gancho 90°), N13 Ø16 na cabeça ancorados 60 cm no corpo, estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e abaixo do recuo) + grampos N3, N14 Ø8 c/10 na cabeça.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,50), costura Ø8 c/10 em 2/3 d. CP-VB nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +9,30 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (30 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face A para cima.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 16 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; ND-LET-PP01 det. 5), rente à face das placas, centrada no pilar, uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm); os 2 consoles CS-1 das placas são soldados nela na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação no ND-LET-PP01). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face B: lisa (só as chaves do cálice).
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	ESPERAS ES-1F DO APOIO ST-1F DA ÚLTIMA TERÇA; CE-1 DOS CONSOLES CS-1 D
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-08	1	63,7	2,55

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-08 (FAMÍLIA 40×60) — P2 L9 canto — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PL08	06	01/01	A0

1º DIEDRO
