

LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9 (vista de fora) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA B — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 40 PEÇAS — 126,4 t

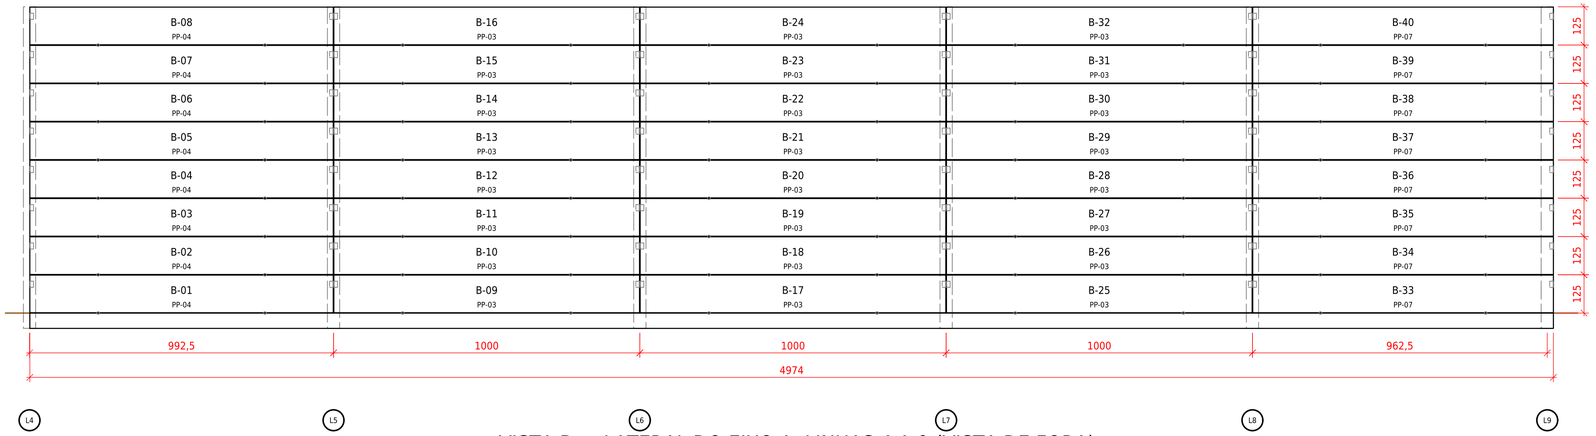


VISTA B — LATERAL DO EIXO A, LINHAS 4 A 9 (VISTA DE FORA)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

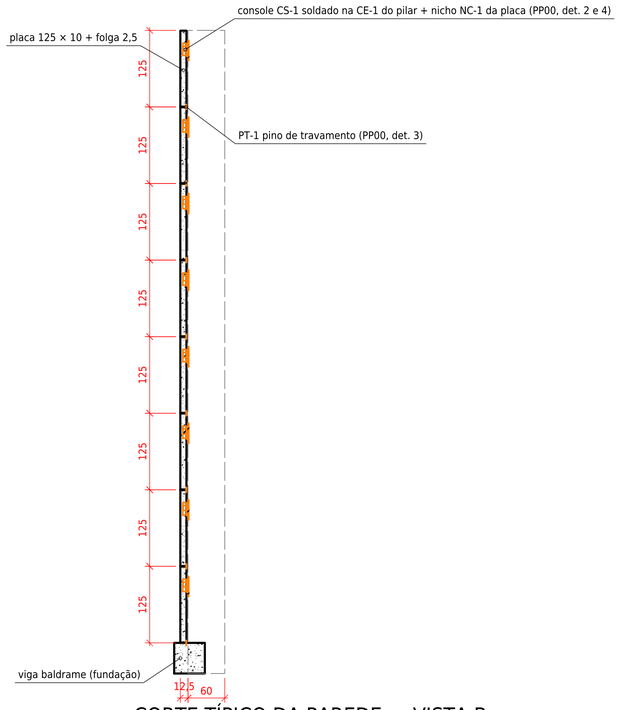

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA B

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)

SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	B-01	PP-04	990,5	+0,00	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
2	B-02	PP-04	990,5	+1,25	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
3	B-03	PP-04	990,5	+2,50	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
4	B-04	PP-04	990,5	+3,75	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
5	B-05	PP-04	990,5	+5,00	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
6	B-06	PP-04	990,5	+6,25	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
7	B-07	PP-04	990,5	+7,50	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
8	B-08	PP-04	990,5	+8,75	3,15	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
9	B-09	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
10	B-10	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
11	B-11	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
12	B-12	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
13	B-13	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
14	B-14	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
15	B-15	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
16	B-16	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
17	B-17	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
18	B-18	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
19	B-19	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
20	B-20	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
21	B-21	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
22	B-22	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
23	B-23	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
24	B-24	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
25	B-25	PP-03	998,0	+0,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
26	B-26	PP-03	998,0	+1,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
27	B-27	PP-03	998,0	+2,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
28	B-28	PP-03	998,0	+3,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
29	B-29	PP-03	998,0	+5,00	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
30	B-30	PP-03	998,0	+6,25	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
31	B-31	PP-03	998,0	+7,50	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
32	B-32	PP-03	998,0	+8,75	3,17	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
33	B-33	PP-07	981,5	+0,00	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
34	B-34	PP-07	981,5	+1,25	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
35	B-35	PP-07	981,5	+2,50	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
36	B-36	PP-07	981,5	+3,75	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
37	B-37	PP-07	981,5	+5,00	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
38	B-38	PP-07	981,5	+6,25	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
39	B-39	PP-07	981,5	+7,50	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
40	B-40	PP-07	981,5	+8,75	3,12	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-03	998,0	24	76,2
PP-04	990,5	8	25,2
PP-07	981,5	8	25,0
	total	40	126,4

NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: B-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Antes da placa: soldar os 2 consoles CS-1 nas chapas de espera CE-1 dos pilares, no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso superior M20 (nível ±20 mm); afastamento 25 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Instalar os 2 pinos PT-1 na junta de baixo (ou as 2 travas PT-2 no pé, nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB alinhadas (4 por face, cobrimento 2,0), 138,2 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 80 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Solda de campo do CS-1 na CE-1: filete 6 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio (DEC-026).
5. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CADA PLACA NO SEU CONSOLE CS-1 (SOLDADO NA CE-1) + NIC
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA B: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-B	06	02/08	A1

1º DIEDRO
