
PAREDE INTERNA DA LINHA 2 (face do pavilhão) · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

VISTA G — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 23 PEÇAS — 73,2 t

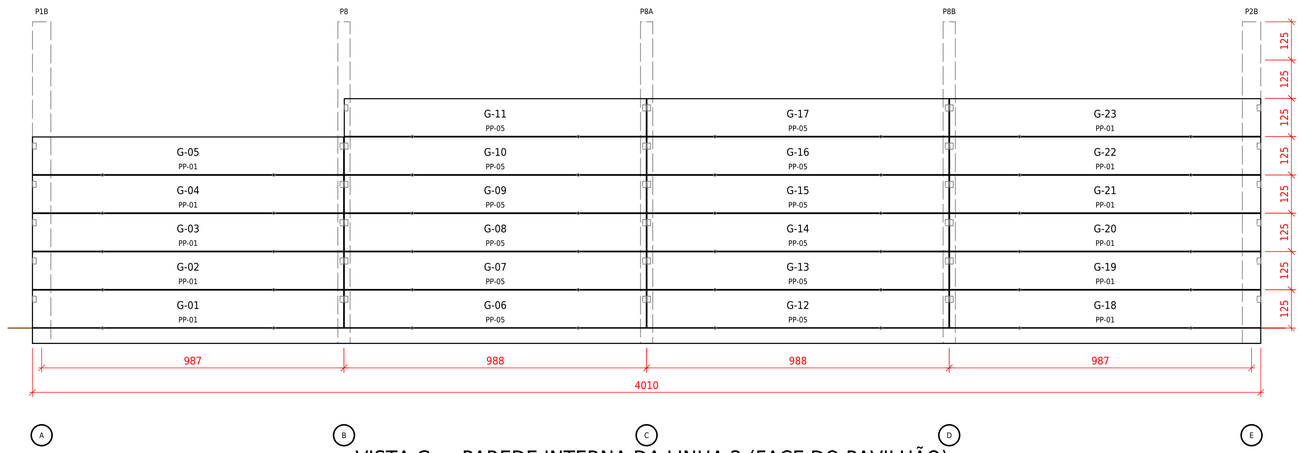

VISTA G — PAREDE INTERNA DA LINHA 2 (FACE DO PAVILHÃO)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)

LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)


SEQ	PEÇA	TIPO	L (cm)	BASE	PESO (t)	APOIO DA PEÇA
1	G-01	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
2	G-02	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
3	G-03	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
4	G-04	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
5	G-05	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
6	G-06	PP-05	986,0	+0,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
7	G-07	PP-05	986,0	+1,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
8	G-08	PP-05	986,0	+2,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
9	G-09	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
10	G-10	PP-05	986,0	+5,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
11	G-11	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
12	G-12	PP-05	986,0	+0,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
13	G-13	PP-05	986,0	+1,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
14	G-14	PP-05	986,0	+2,50	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
15	G-15	PP-05	986,0	+3,75	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
16	G-16	PP-05	986,0	+5,00	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
17	G-17	PP-05	986,0	+6,25	3,14	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
18	G-18	PP-01	1016,0	+0,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
19	G-19	PP-01	1016,0	+1,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
20	G-20	PP-01	1016,0	+2,50	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
21	G-21	PP-01	1016,0	+3,75	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
22	G-22	PP-01	1016,0	+5,00	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)
23	G-23	PP-01	1016,0	+6,25	3,23	2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé)

RESUMO POR TIPO

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)
PP-01	1016,0	11	35,5
PP-05	986,0	12	37,6
	total	23	73,2


NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: G-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Antes da placa: soldar os 2 consoles CS-1 nas chapas de espera CE-1 dos pilares, no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso superior M20 (nível ±20 mm); afastamento 25 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Instalar os 2 pinos PT-1 na junta de baixo (ou as 2 travas PT-2 no pé, nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB alinhadas (4 por face, cobrimento 2,0), 138,2 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 46 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Solda de campo do CS-1 na CE-1: filete 6 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio (DEC-026).
5. Placas na face do pavilhão (a laje do mezanino passa na face do anexo), até +7,50 (vão A-B até +6,25: TS-01 baixa junto ao eixo A); acima, fechamento metálico leve até a telha.
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

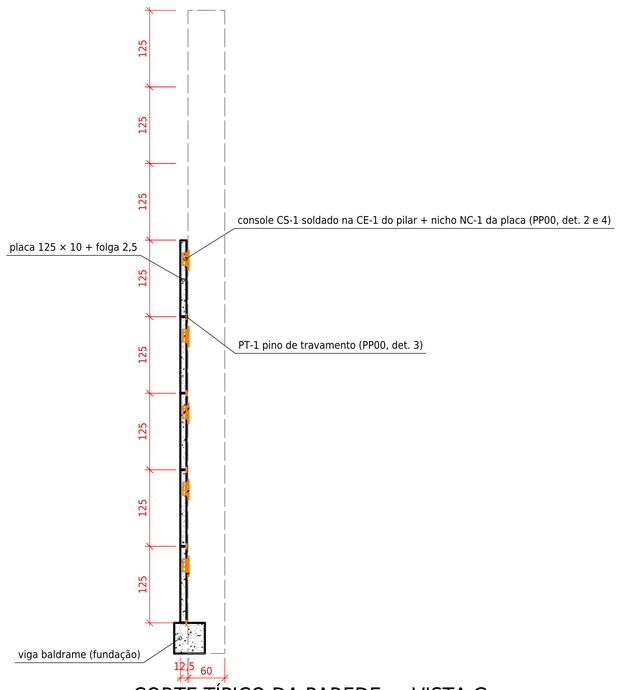

CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA G

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: CADA PLACA NO SEU CONSOLE CS-1 (SOLDADO NA CE-1) + NIC
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm
03	14/10/2026	PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTA G: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP-G	06	06/08	A1

1º DIEDRO
