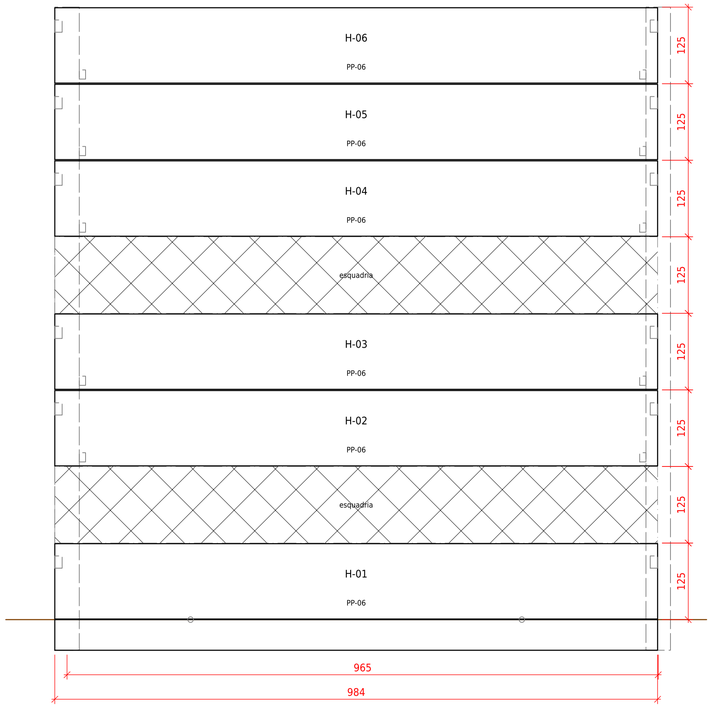
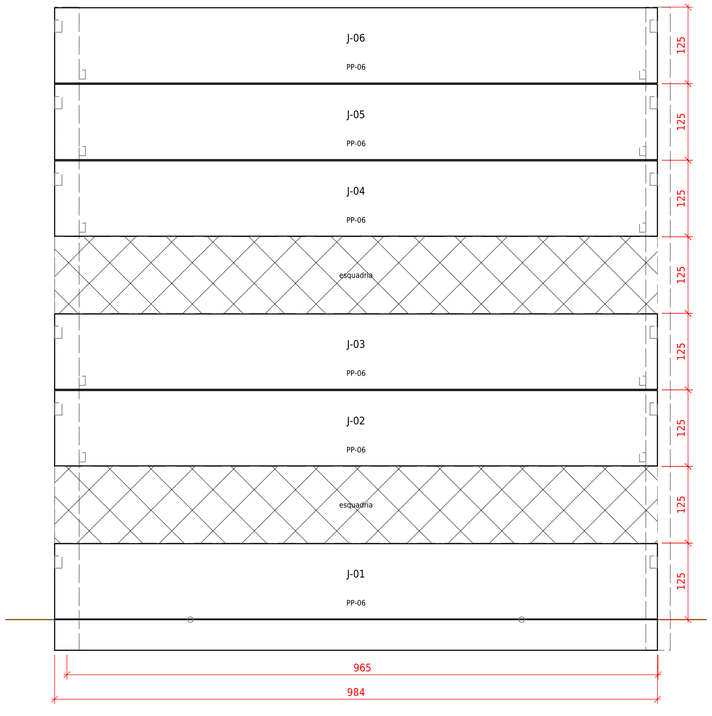
LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2 · LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2 · produzir e montar na ordem dos números · placa típica: ND-LET-PP00

# VISTA H E J — PLACAS PROTENDIDAS 125 × 10 — 12 PEÇAS — 37,6 t



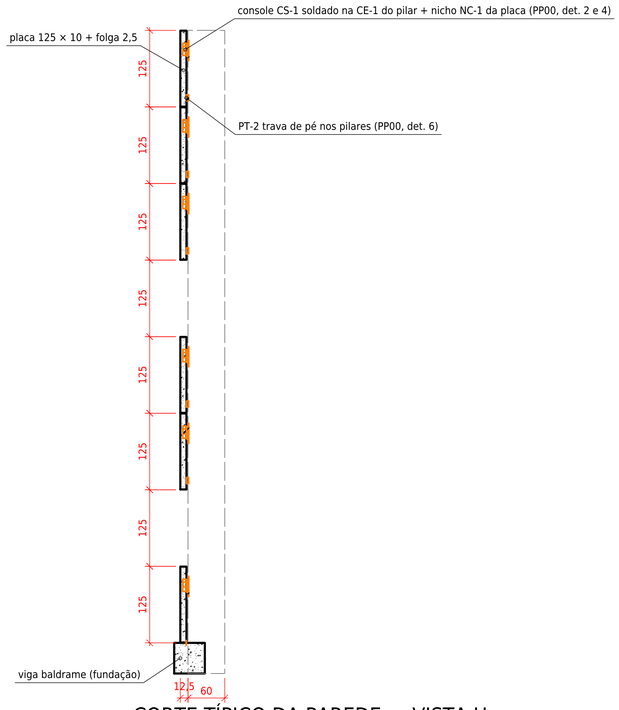

## VISTA H — LATERAL DO ANEXO, EIXO A, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)





## VISTA J — LATERAL DO ANEXO, EIXO E, LINHAS 1 A 2

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — peças numeradas na ordem de produção e montagem (vão a vão, de baixo para cima)




## CORTE TÍPICO DA PAREDE — VISTA H

ESC. 1:50 — COTAS EM CM — placas por fora do pilar; ligação em cada fiada




## PLANTA-CHAVE

ESC. 1:700 — COTAS EM CM — parede da(s) vista(s) em destaque

### LISTA DE PRODUÇÃO E MONTAGEM (na ordem)

| SEQ | PEÇA | TIPO | L (cm) | BASE | PESO (t) | APOIO DA PEÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-01 | PP-06 | 984,0 | +0,00 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé) |
| 2 | H-02 | PP-06 | 984,0 | +2,50 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 3 | H-03 | PP-06 | 984,0 | +3,75 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 4 | H-04 | PP-06 | 984,0 | +6,25 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 5 | H-05 | PP-06 | 984,0 | +7,50 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 6 | H-06 | PP-06 | 984,0 | +8,75 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 1 | J-01 | PP-06 | 984,0 | +0,00 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-1 (pé) |
| 2 | J-02 | PP-06 | 984,0 | +2,50 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 3 | J-03 | PP-06 | 984,0 | +3,75 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 4 | J-04 | PP-06 | 984,0 | +6,25 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 5 | J-05 | PP-06 | 984,0 | +7,50 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |
| 6 | J-06 | PP-06 | 984,0 | +8,75 | 3,13 | 2 consoles CS-1 + 2 PT-2 (pé) |

### RESUMO POR TIPO

| TIPO | L (cm) | QT | PESO (t) |
|---|---|---|---|
| PP-06 | 984,0 | 12 | 37,6 |
| | total | 12 | 37,6 |

## NOTAS

1. Produzir na ordem da coluna SEQ e etiquetar cada peça com o código (ex.: H-01) e o tipo; estocar por vista, na ordem inversa da montagem.
2. Montagem vão a vão, de baixo para cima. Antes da placa: soldar os 2 consoles CS-1 nas chapas de espera CE-1 dos pilares, no nível marcado pela topografia. A placa encosta no pilar com o braço do console entrando no nicho NC-1 de cada ponta e desce até o teto do nicho apoiar no parafuso superior M20 (nível ±20 mm); afastamento 25 mm pelo parafuso frontal M16. Cada placa leva só o próprio peso: folga de 5 mm na junta macho-fêmea. Instalar os 2 pinos PT-1 na junta de baixo (ou as 2 travas PT-2 no pé, nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste (PP00, det. 2 a 6).
3. Placa protendida 125 × 10, C40, 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB alinhadas (4 por face, cobrimento 2,0), 138,2 kN por cordoalha no macaco: seção, insertos, alças e ligações na ND-LET-PP00.
4. Consoles CS-1 nesta prancha: 24 (tracejado na elevação = nicho NC-1 atrás da placa; círculo tracejado = pino PT-1 na junta de baixo; retângulo tracejado no pé = trava PT-2 nos pilares, nas placas sem pano contínuo até o baldrame). Solda de campo do CS-1 na CE-1: filete 6 mm E70XX nos 2 lados verticais, inspeção visual 100 %, galvanização a frio (DEC-026).
5. Faixas hachuradas: esquadrias do anexo (R01), sem placa, de +1,25 a +2,50 e de +5,00 a +6,25; toda placa fica nos seus 2 consoles CS-1, também acima das faixas.
6. Cotas de concreto em cm, níveis em m. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 06 | 17/10/2026 | FIXAÇÃO TREJOR: CADA PLACA NO SEU CONSOLE CS-1 (SOLDADO NA CE-1) + NIC |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM VT; JUNTA VERTICAL 20 mm |
| 03 | 14/10/2026 | PLACA 125 × 10 (8 Ø12,7); LIGAÇÕES PARAFUSADAS (TRILHO + BUCHA), SEM S |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL — CONFORME AS VISTAS DO FECHAMENTO DO R01 |


ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACAS DE FECHAMENTO PROTENDIDAS — VISTAS H E J: PRODUÇÃO E MONTAGEM EM SEQUÊNCIA

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 17/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-PP-HJ | 06 | 07/08 | A1 |

1º DIEDRO
